


平成24年度

長崎県公共事業評価監視委員会意見書

平成24年8月23日

長崎県公共事業評価監視委員会

委員長 園田 圭介



平成24年度長崎県公共事業評価監視委員会意見書

1. 意見

諮問があった再評価対象23事業及び事後評価対象4事業については、いずれも対応方針（原案）どおり認めることに決定しましたので、答申します。

2. 審議過程における意見

【再評価対象事業】

・上対馬東地区外3地区 水産生産基盤整備事業（事業主体；対馬市）

事業途中で港内静穏度の効果が上がっていることや漁業情勢の変化などを踏まえ、思い切った計画の見直しを行っている。

当初計画の見通しが違った理由などについて検証を行い、今後の事業へ生かすことを期待する。

一方、事業自体は、若年層の就労意欲を増進させ、担い手支援につながることから、整備促進を図られたい。

・瀬戸・芦辺地区 地域自主戦略交付金（漁業集落環境整備事業）（事業主体；壱岐市）

近年の人口減少を背景とした計画区域除外等の事業規模の見直しについては、妥当であると判断する。

なお、除外地域に対しても、負担の公平さや完成時期等に大きな差がないように、配慮されたい。

【その他】

- ・社会資本整備にあたり、厳しい財政状況の中にあっても、限られた財源を有効に活用し、集中投資を行い、事業効果の早期発現を図られたい。
- ・施設の整備が、地域住民の生活向上に貢献している状況などについて、積極的に広報活動に努め、継続的にアピールすること。

3. 平成24年度の審議経過

- ・第1回委員会（平成24年6月4日開催）
再評価及び事後評価対象事業の説明及び審議
現地調査箇所の選定
- ・第2回委員会（平成24年8月2日、3日開催）
現地調査
- ・第3回委員会（平成24年8月10日開催）
再評価詳細審議事業の審議


注）詳細審議事業の選定に際して配慮した事項

- ①計画見直し等がある事業
- ②事業進捗が遅れている事業


平成24年度 再評価対象事業数一覧

担当部	担当課	対象事業数	県事業	市町村事業	備 考
水産部		8	0	8	
	漁港漁場課	8	0	8	
農林部		0	0	0	
	農村整備課	0	0	0	
	森林整備室	0	0	0	
環境部		3	1	2	
	水環境対策課	3	1	2	
土木部		12	7	5	
	都市計画課	2	1	1	
	道路建設課	3	3	0	
	道路維持課	2	0	2	
	港湾課	1	1	0	
	河川課	2	1	1	
	砂防課	1	1	0	
	住宅課	1	0	1	
合 計		23	8	15	


水産部 事業位置図(再評価)

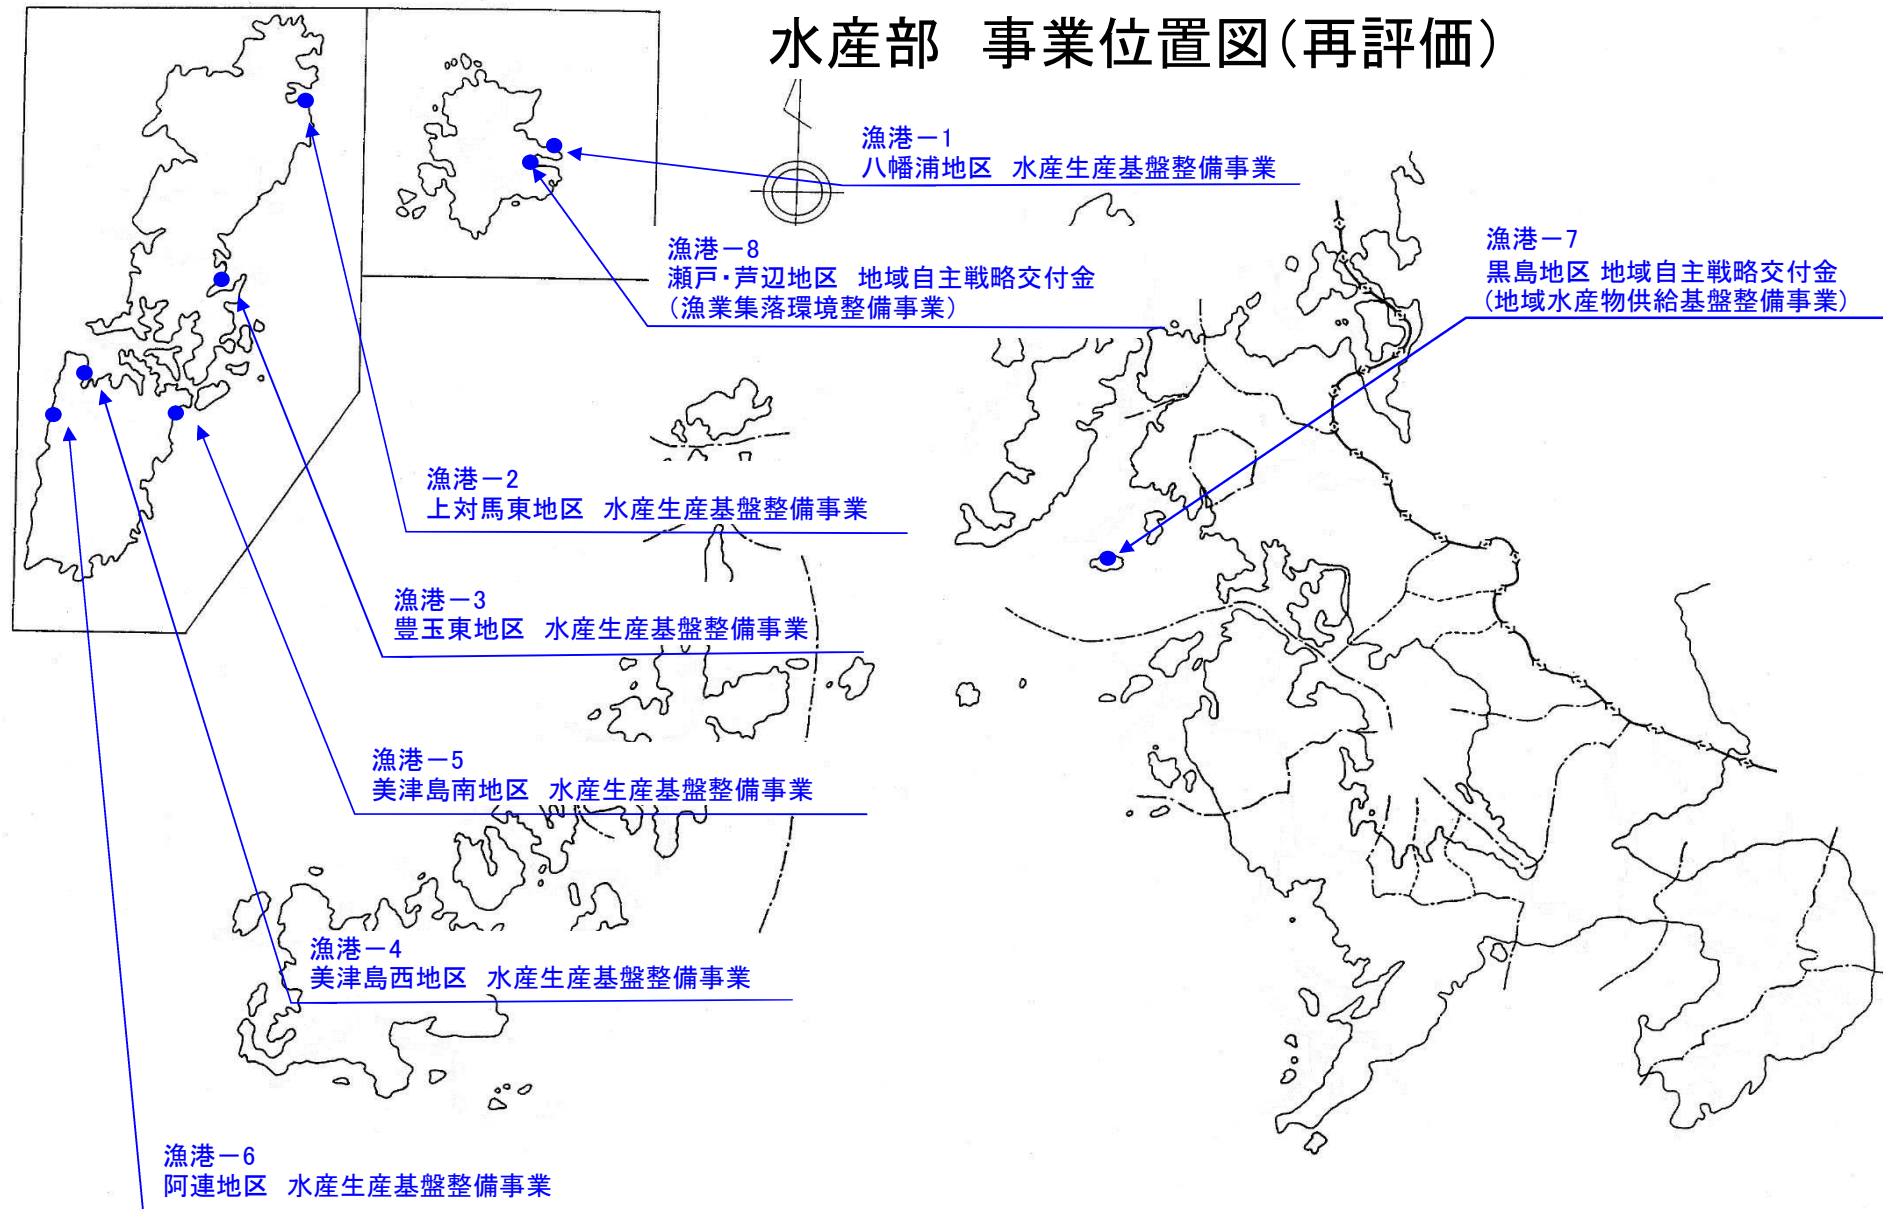

環境部 事業位置図(再評価)

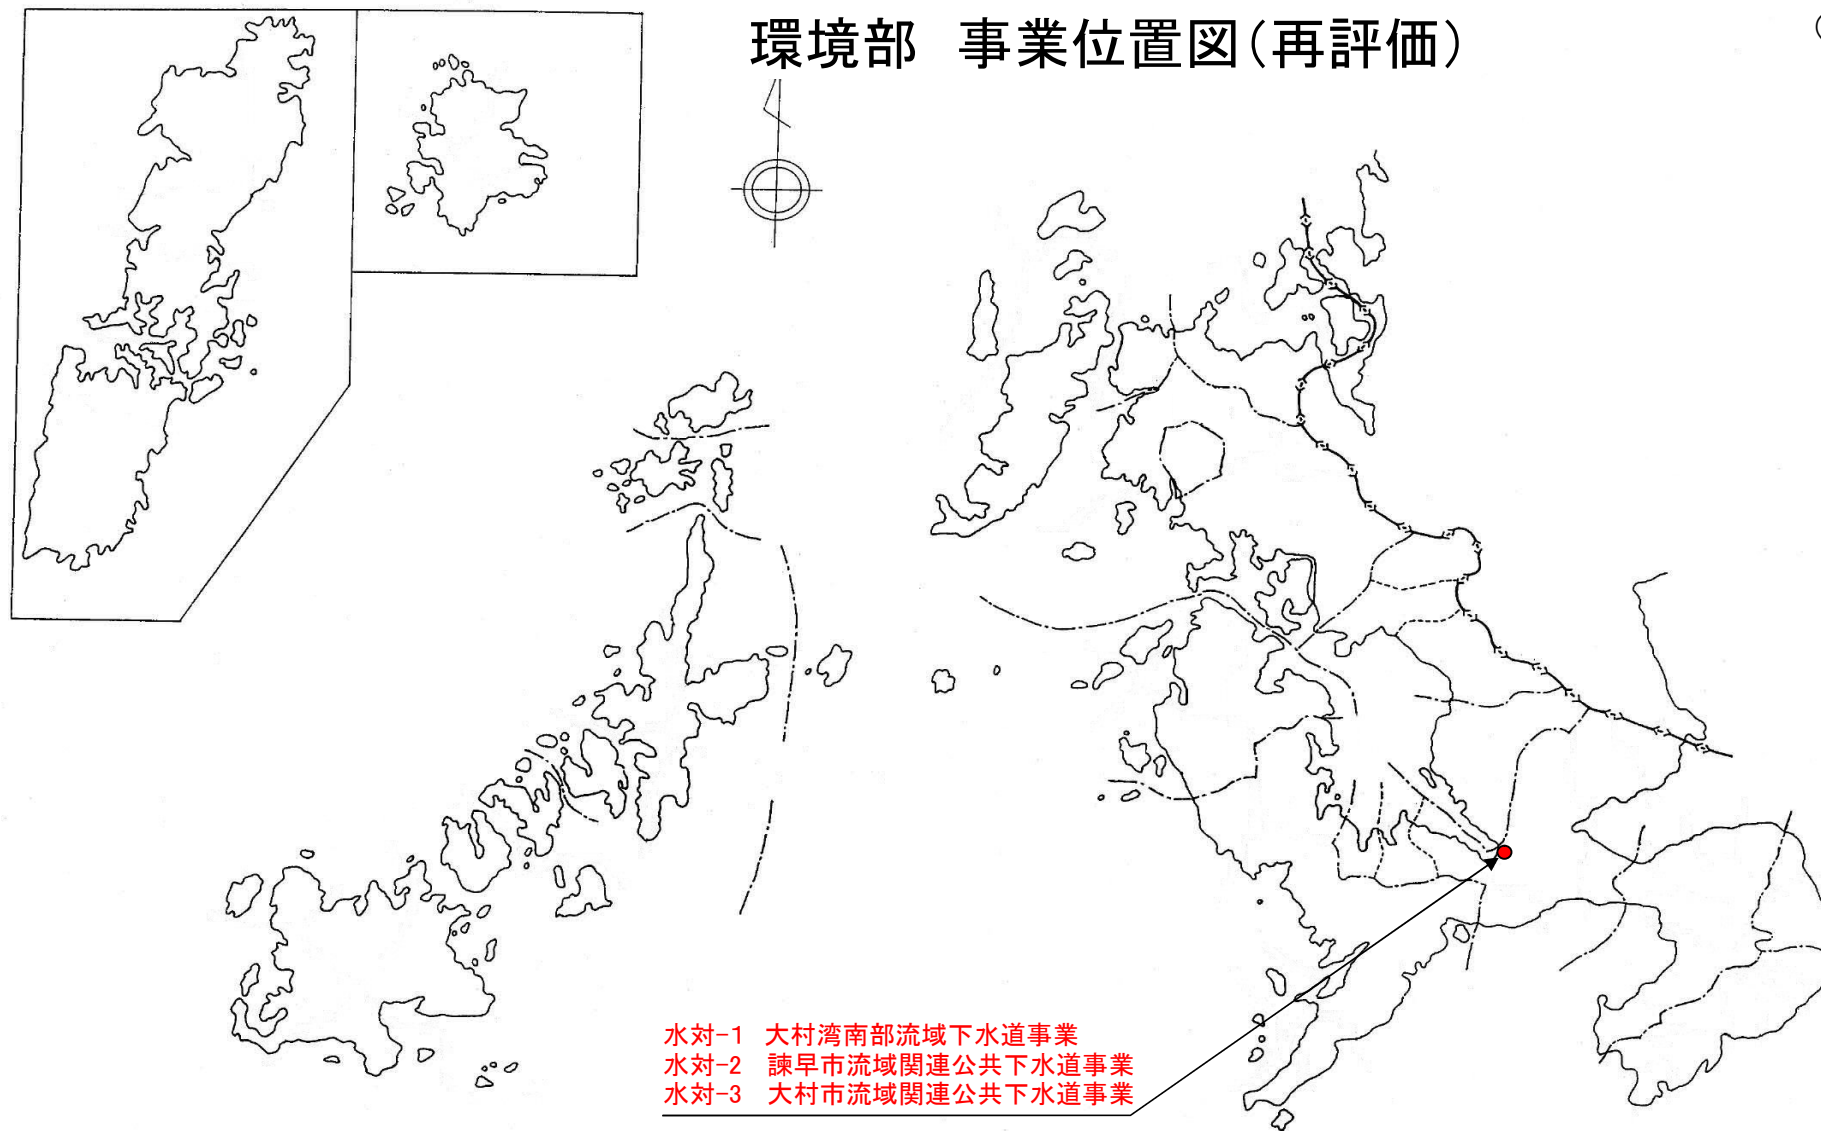

土木部 事業位置図(再評価)

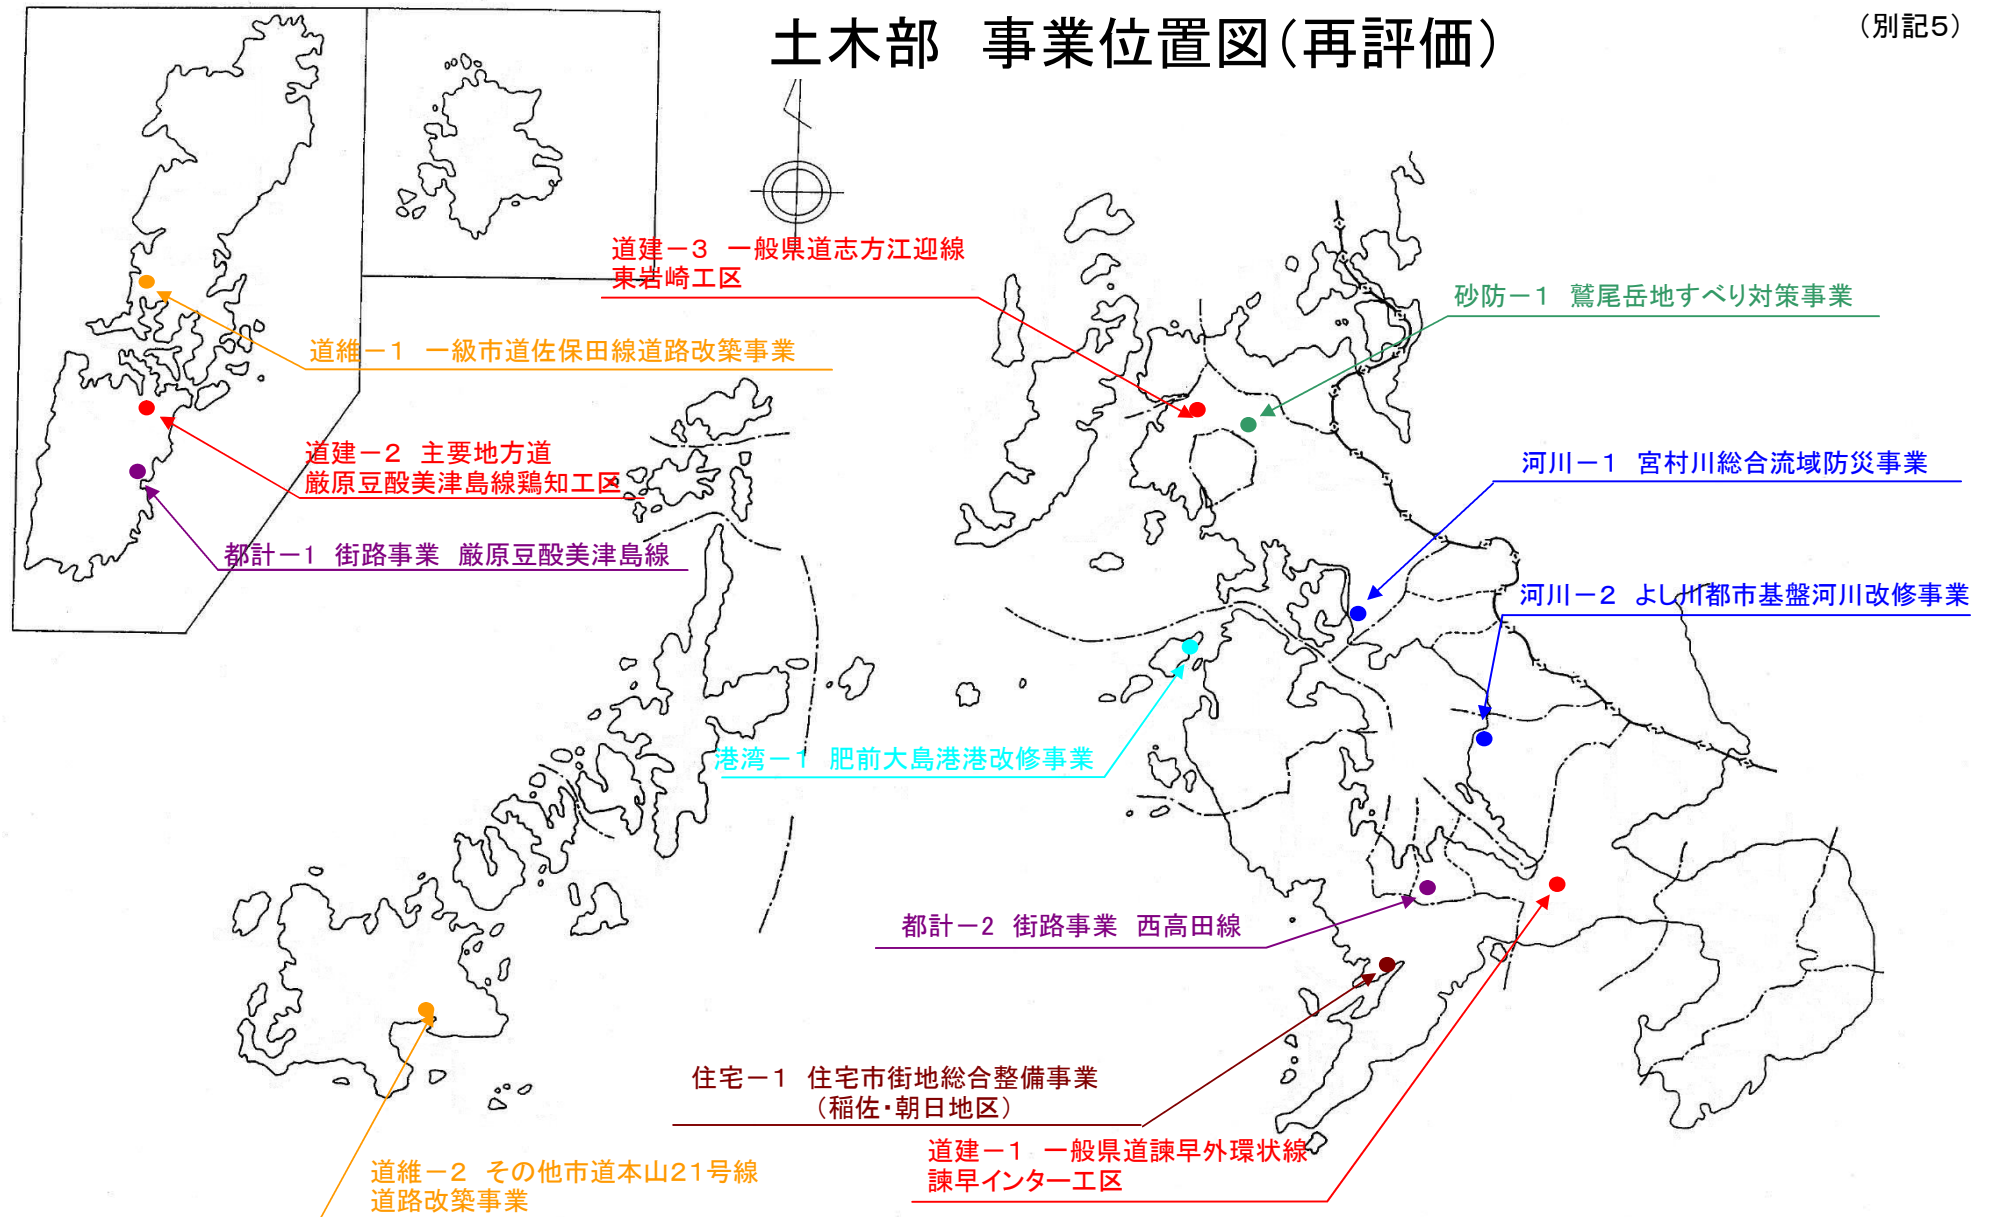

平成 24 年度 再評価対象事業一覧表

整理番号	事業計画								事業 進捗率 (%)	再評価の 理由	前回審議 年度	対応方針(原案)
	事業名	施設名	事業 主体	事業箇所	事業概要	工 期		事業費 (億円)				
						着工	完了					
					上段：当初 下段：変更							
漁港-1	水産生産基盤整備事業	八幡浦地区 (八幡浦漁港) (八幡浦漁場)	市	壱岐市	(八幡浦地区) 外防波堤 300m 突 堤 80m -3m岸壁(浮桟橋) 1基 用地舗装 400㎡ 臨港道路 280m (柏崎地区) 突 堤 45m -3m岸壁(改良) 48.6m -3m航路 12,000㎡ (石垣地区) -3m岸壁(改良) 50m 突 堤 40m (漁場) 並型魚礁 4,424空㎡ 着底基質 2.5ha	H14	H23	39.0	86	事業採択後 10年経過	—	継続
					H14	H26	45.9					
漁港-2	水産生産基盤整備事業	上対馬東地区 (五根緒漁港) (唐舟志漁港) (舟志漁場) (五根緒漁場)	市	対馬市	<唐舟志漁港> 防波堤(B)L=30m →廃止 防波堤(A)(改良)L=20m 東防波堤(改良)L=50m 護岸(A)(改良)L=42m 護岸(B)(改良)L=84m 等 <五根緒漁港> 沖防波堤L=150m 防波堤(A)L=30m 南防波堤L=80m →廃止 -3.5m航路A=1,400㎡→廃止 道路L=180m 等 <舟志漁場> :完了 着定基質A=3,750㎡ <五根緒漁場> 着定基質A=5,750㎡	H14	H23	32.0	84	事業採択後 10年経過	—	見直し 継続
					<唐舟志漁港> :完了 防波堤(A)(改良)L=20m 東防波堤(改良)L=50m 護岸(A)(改良)L=42m 護岸(B)(改良)L=84m 等 <五根緒漁港> 沖防波堤L=150m 防波堤(A)L=30m 防波堤(A)(改良)L=27m 北防波堤(改良)L=66m 南防波堤(改良)L=32m 等 <舟志漁場> :完了 着定基質A=3,750㎡ <五根緒漁場> :完了 着定基質A=5,750㎡	H14	H26	17.8				

平成 24 年度 再評価対象事業一覧表

整理番号	事業計画								事業 進捗率 (%)	再評価の 理由	前回審議 年度	対応方針(原案)
	事業名	施設名	事業 主体	事業箇所	事業概要	工 期		事業費 (億円)				
						着工	完了					
上段：当初						下段：変更						
漁港-3	水産生産基盤整備事業	豊玉東地区 (千尋藻漁港) (塩浜漁港) (千尋藻漁場)	市	対馬市	<千尋藻漁港> 防波堤A(改良)L=290m 防波堤F(改良)L=6m →廃止 -1m物揚場L=90m 船揚場L=20m 道路AL=240m 等 <塩浜漁港> 防波堤AL=50m 防波堤CL=120m →廃止 護岸(改良)L=15m 浮棧橋1基 -1m物揚場L=20m 道路AL=510m 蓄養水域A=6,000㎡ →廃止 等 <千尋藻漁場> 並型魚礁V=1,509空㎡	H14	H23	21.6	39	事業採択後 10年経過	—	見直し 継続
					<千尋藻漁港> 防波堤A(改良)L=290m -1m物揚場L=90m 船揚場L=20m 道路AL=240m 用地C(舗装)A=2,700㎡ ←追加 用地D(舗装)A=2,300㎡ ←追加 等 <塩浜漁港> 防波堤AL=50m 護岸(改良)L=15m 浮棧橋1基 -1m物揚場L=20m 道路AL=510m 等 <千尋藻漁場> 並型魚礁V=1,509空㎡	H14	H28	20.0				
漁港-4	水産生産基盤整備事業	美津島西地区 (西海漁港) (尾崎漁港) (尾崎(地)漁場)	市	対馬市	<西海漁港> -2m物揚場L=70m 道路L=180m 用地(A)A=500㎡ 用地(B)A=1,600㎡ 用地(C)A=1,000㎡ <尾崎漁港> 沖防波堤L=350m -3m岸壁(改良)L=110m 用地A(舗装)A=2,000㎡ 用地B(舗装)A=2,000㎡ 用地C(舗装)A=300㎡ <尾崎漁場> 着定基質0.5ha	H14	H23	18.3	62	事業採択後 10年経過	—	継続
					H14	H28	17.7					

平成 24 年度 再評価対象事業一覧表

整理番号	事業計画								事業 進捗率 (%)	再評価の 理由	前回審議 年度	対応方針(原案)
	事業名	施設名	事業 主体	事業箇所	事業概要	工 期		事業費 (億円)				
						着工	完了					
					上段：当初 下段：変更							
漁港-5	水産生産基盤整備事業	美津島南地区 (高浜漁港) (根緒漁港) (高浜(地)漁場) (高浜(並)漁場)	市	対馬市	<高浜漁港> 外防波堤L=150m 南防波堤L=40m →廃止 南防波堤(改良)L=100m 護岸(改良)L=15m →廃止 浮棧橋1基 道路L=420m 用地1式 <根緒漁港> 南防波堤L=50m →廃止 北防波堤L=16m →廃止 南防波堤(改良)L=150m -3m岸壁L=60m →廃止 用地A=300㎡ →廃止 <高浜(並)漁場> 並型魚礁V=1,260空㎡ <高浜(地)漁場> 着定基質1ha	H14	H23	36.2	82	事業採択後 10年経過	—	見直し 継続
					<高浜漁港> 外防波堤L=150m 南防波堤(改良)L=100m 浮棧橋1基 道路L=420m 用地1式 <根緒漁港> 南防波堤(改良)L=150m <高浜(並)漁場> 並型魚礁V=1,260空㎡ <高浜(地)漁場> 着定基質1ha	H14	H27	19.1				
漁港-6	水産生産基盤整備事業	阿連地区 (阿連漁港)	市	対馬市	<阿連漁港> A防波堤L=150m→廃止 B防波堤L=200m→廃止 内防波堤L=30m→廃止 導流堤L=50m 浮棧橋1基 -3m岸壁L=50m→廃止 道路L=35m→廃止 用地(水域)A=5,000㎡→廃止 用地A=920㎡→廃止	H14	H23	47.9	68	事業採択後 10年経過	—	見直し 継続
					<阿連漁港> B防波堤L=200m C防波堤L=40m←追加 南防波堤(改良)L=70m←追加 導流堤L=50m 浮棧橋1基	H14	H28	29.0				

平成 24 年度 再評価対象事業一覧表

整理番号	事業計画								事業 進捗率 (%)	再評価の 理由	前回審議 年度	対応方針(原案)
	事業名	施設名	事業 主体	事業箇所	事業概要	工 期		事業費 (億円)				
						着工	完了					
					上段：当初 下段：変更							
漁港-7	地域自主戦略交付金事業 (地域水産物供給基盤整備 事業)	黒島地区 (黒島漁港) (黒島漁場)	市	佐世保市	<黒島漁港> 北防波堤 L=20m 第2沖防波堤 L=80m 外防波堤(改良) L=150m ←追加 西防波堤(改良) L=140m ←追加 N護岸(改良) L=115m N護岸(改良)L=165m←追加 -2m物揚場 L=95m 浮桟橋=1基 -3m岸壁A(改良) L=178m -3m岸壁B(改良) L=43.5m -2.5m物揚場(改良) L=38m 用地=5,300m2 用地A(改良)=1,400m2 用地B(改良)=174m2 道路 L=370m <黒島漁場> 魚礁=1,429空m3	H14	H22	9.1	62	事業採択後 10年経過	H18	継続
					H14	H26	14.7					
漁港-8	地域自主戦略交付金事業 (漁業集落環境整備事業)	瀬戸・芦辺地区	市	壱岐市	1号集落道 220m 2号集落道 120m 3号集落道 250m 5号集落道 170m 排水管路施設 23,000m 排水処理施設 1式 1号排水路 235m 照明施設 1式 終末処理場 8,000㎡	H14	H23	43.1	76	事業採択後 10年経過	H18	見直し 継続
					1号集落道 237m 2号集落道 215m 3号集落道 314m 5号集落道 255m 排水管路施設 20,965m 排水処理施設 1式 1号排水路 213m 照明施設 1式 終末処理場 8,300㎡	H14	H27	31.8				
水対-1	流域下水道事業	大村湾南部	県	諫早市 大村市	計画区域 1,644ha 計画人口 43,000人 計画汚水量(日最大) 32,300m3/日 幹線管渠 5,300m	H5	H22	230.0	93	再評価後 10年経過	H14	継続
					H5	H42	203.5					
水対-2	公共下水道事業	諫早市流域関連 公共下水道	市	諫早市	計画区域 1,527ha 計画人口 41,200人 計画汚水(日最大) 31,000m3/日	H6	H22	294.0	54	再評価後 10年経過	H14	継続
					H6	H42	300.1					
水対-3	公共下水道事業	大村市流域関連 公共下水道	市	大村市	計画区域 117ha 計画人口 1,800人 計画汚水量(日最大) 1,300m3/日	H8	H22	34.0	61	再評価後 10年経過	H14	継続
					H8	H42	27.6					

平成 24 年度 再評価対象事業一覧表


整理番号	事業計画								事業 進捗率 (%)	再評価の 理由	前回審議 年度	対応方針(原案)
	事業名	施設名	事業 主体	事業箇所	事業概要	工 期		事業費 (億円)				
						着工	完了					
上段：当初						下段：変更						
都計－１	街路事業	厳原豆酞美津島線	県	対馬市	延長 L=560m 幅員 W=6(16)m	H10	H24	28.0	97	再評価後 5年経過	H19	継続
						H10	H26	29.0				
都計－２	街路事業	西高田線	町	長与町	延長 L=1,270m 幅員 W=6(17)m	H15	H21	41.3	14	事業採択後 10年経過	－	継続
						H15	H31	46.0				
道建－１	道路改築事業	一般県道諫早外環状線道路改 良工事 諫早インター工区	県	諫早市	延長 L=4,300m 幅員 W=7.0(12.0)m	H20	H26	169.0	24	事業採択後 5年経過	－	継続
						H20	H27	169.0				
道建－２	道路改築事業	主要地方道厳原豆酞美津島線 道路改良工事(雞知工区)	県	対馬市	延長=1,020m 幅員=6.0(12.0)m	H15	H21	21.0	94	事業採択後 10年経過	－	継続
						H15	H26	25.0				
道建－３	道路改築事業	一般県道志方江迎線（東岩崎 工区）	県	佐世保市	道路事業 L=1,370m W=6.0(8.0)m	H15	H17	5.0	66	事業採択後 10年経過	－	継続
						H15	H26	6.8				
道維－１	道路改築事業	市道佐保田線	市	対馬市	L=2.12km W=5.5(8.75)m 改良 L=2,073m 橋梁 L=47m 舗装 L=2,120m	H10	H24	22.3	91	再評価後 5年経過	H19	継続
						H10	H29	20.9				
道維－２	道路改築事業	市道 本山21号線	市	五島市	延長 L=3.7km 幅員 W=6.0(9.75)m	H15	H21	13.7	90	事業採択後 10年経過	－	継続
						H15	H25	14.0				
港湾－１	肥前大島港改修事業	寺島地区 国内物流ターミナル整備	県	西海市 大島町	防波堤 100m 護岸(防波) 75m 泊地(-7.5m) 18,680m2 岸壁(-7.5m) 130m 道路(B) 6m×1,430m ふ頭用地 6,300m2	H10	H22	38.6	91	再評価後 5年経過	H19	継続
						H10	H25	38.4				
河川－１	総合流域防災事業	宮村川	県	佐世保市	改修延長 L=2,500m 河道拡幅、河床掘削、築堤、護岸整備、橋梁架替及び堰改築	S40	H25	23.0	83	再評価後 5年経過	H19	継続
						S40	H29	27.0				
河川－２	都市基幹河川 改修事業	よし川	市	大村市	改修延長 L=1,895m 河道拡幅、河床掘削、護岸整備、橋梁架替及び堰改築	H10	H35	38.0	35	再評価後 5年経過	H19	継続
						H10	H35	38.0				
砂防－１	地すべり対策事業	鷲尾岳地区	県	佐世保市 江迎町 志戸氏	集水井工 N=32基 深礎工 N=36本 アンカー工 N=224本 排水トンネル N=5本 頭部法面工 A=4,900m2	S32	H30	100.4	95	再評価後 5年経過	H19	継続
						S32	H29	100.4				
住宅－１	住宅市街地 総合整備事業	稲佐・朝日地区	市	長崎市	道路・公園の整備 共同住宅の建設 老朽住宅の除却等	H10	H23	47.0	36	再評価後 5年経過	H19	継続
						H10	H28	45.8				

平成24年度 事後評価対象事業数一覧

担当部	担当課	対象事業数	県事業	市町村事業	備 考
土木部		4	4	0	
	都市計画課	0	0	0	
	道路建設課	1	1	0	
	道路維持課	0	0	0	
	港湾課	2	2	0	
	河川課	1	1	0	
	砂防課	0	0	0	
	住宅課	0	0	0	
合 計		4	4	0	

(別記5)

土木部 事業位置図(事後評価)

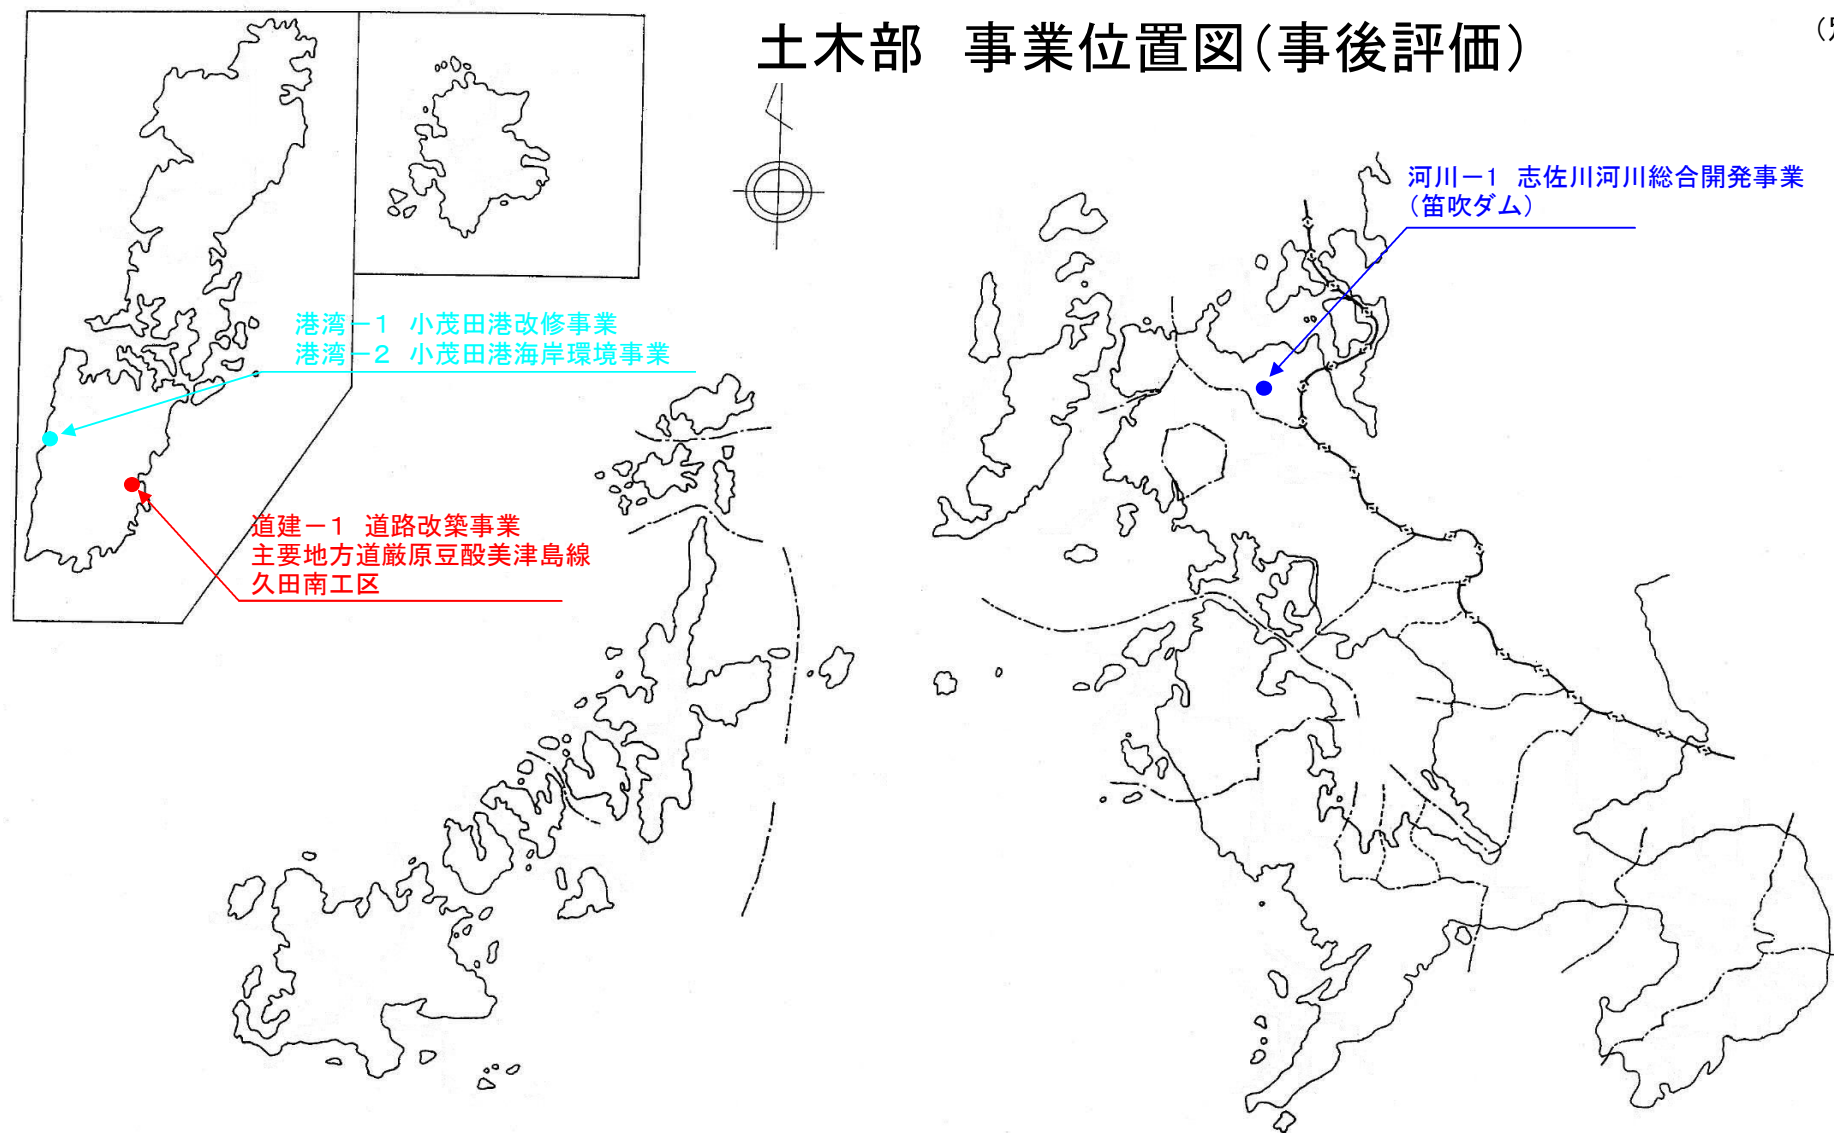

平成24年度 事後評価対象事業の対応方針一覧表

整理 番号	事業計画						事後評価 理由	
	事業名／施設名	事業箇所	事業概要	工 期		事業費 (億円)		
				着工	完了			
道路 ー1	主要地方道厳原豆酸美津島線道路改良事業 ／久田南工区	対馬市	L=2.42km W=5.5(7.0)m	H6	H19	34億円	再評価実施 全体事業費 10億円以上 事業完了後 5年	対応方針(原案)
								(評価結果の同種事業への反映等) ・特になし
								委員会の意見
								・原案どおり認める。
								対応方針の決定
								・原案どおり

整理 番号	事業計画						事後評価 理由	
	事業名／施設名	事業箇所	事業概要	工 期		事業費		
				着工	完了	(億円)		
港湾 ー1	小茂田港改修事業 ／小茂田地区小型船だまり整備	対馬市	【補助事業】 防波堤(沖) 150m 防波堤(東) 263m 防波堤(北) 175m 護岸(防波) 26m 航路(-3.0m) 3,520㎡ 泊地(-3.0m) 25,500㎡ 泊地(-1.0m) 1,120㎡ 物揚場(-3.0m) 110m 物揚場(-3.0m)(A) 70m 船揚場 20m 浮棧橋 1式 道路 6×320m 【起債事業】 ふ頭用地 29,000㎡	S55	H19	53	再評価実施 全体事業費 10億円以上 事業完了後 5年	対応方針(原案) (評価結果の同種事業への反映等) ・特になし 委員会の意見 ・原案どおり認める。 対応方針の決定 ・原案どおり
港湾 ー2	小茂田港海岸環境整備事業 ／小茂田地区海岸環境整備	対馬市	離岸堤 150m 突堤 110m 護岸(改良) 315m 人工海浜(養浜) 50,000㎡ ³ 遊歩道 4,000㎡ 植栽 4,000㎡	H5	H19	22.3	再評価実施 全体事業費 10億円以上 事業完了後 5年	対応方針(原案) (評価結果の同種事業への反映等) ・特になし 委員会の意見 ・原案どおり認める。 対応方針の決定 ・原案どおり

平成24年度 事後評価対象事業の対応方針一覧表

整理 番号	事業計画						事後評価 理由	
	事業名／施設名	事業箇所	事業概要	工 期		事業費 (億円)		
				着工	完了			
河川 ー1	志佐川河川総合開発事業 ／笛吹ダム	松浦市	重力式コンクリートダム H=59.8m V=231,500m3	H4	H19	208.50	再評価実施 全体事業費 10億円以上 事業完了後 5年	対応方針(原案) (評価結果の同種事業への反映等) ・特になし 委員会の意見 ・原案どおり認める。 対応方針の決定 ・原案どおり
