

平成18年度

長崎県公共事業評価監視委員会意見書

平成18年9月5日

長崎県公共事業評価監視委員会

委員長 武政 剛弘



# 平成18年度長崎県公共事業評価監視委員会意見書

## 1. 意見

諮問があった42事業については、いずれも対応方針（原案）どおり認めることに決定しましたので、答申します。

## 2. 審議過程における意見

### 1) 個別の事業について

#### ・農免農道整備事業 小佐々中央地区

社会経済情勢の変化により、離農が進行していることから事業中止の方針は妥当と認められる。工事未着手区間で用地買収済である土地についての取扱いは、地元への払い下げなどの明確な方針を確立して、積極的な調整に努められたい。

#### ・広域漁港整備事業（特定） 平地区

漁業情勢の変化により、外来漁船用の係留施設を廃止する見直しの方針は妥当と認められる。

#### ・特殊改良一種事業 一般国道382号畠ヶ浦拡幅

共有地の用地問題で事業が長期化するという判断により、事業規模を縮小する方針は妥当と認められる。なお、今回未整備の区間については、共有地の整理ができ次第、事業着手することが望ましい。

### 2) その他

県の総合計画等と調整をとったうえで新規事業の採択を行うとともに、事業の将来展望を明確にすることで、事業の見直し、中止が生じないように努めていただきたい。特に農業・水産業の振興と調和のとれた事業の実施を要望する。

### 3 . 1 8 年度の審議経過


- ・ 第 1 回委員会（平成 1 8 年 6 月 2 0 日開催）  
再評価・事後評価対象事業の説明及び審議  
現地調査箇所の選定
- ・ 第 2 回委員会（平成 1 8 年 8 月 2 日、3 日）  
現地調査、詳細審議事業の選定
- ・ 第 3 回委員会（平成 1 8 年 8 月 3 0 日開催）  
詳細審議事業の審議

注）詳細審議事業の選定に際して配慮した事項  
計画見直し等がある事業  
事業進捗が遅れている事業



## 平成18年度 再評価対象事業数一覧

担当部	担当課	対象事業数	県事業	市町村事業	備考
水産部		9	4	5	
	水産基盤計画課	9	4	5	
農林部		7	6	1	
	農村整備課	5	5	0	
	林務課	2	1	1	
環境部		4	0	4	
	水環境対策課	4	0	4	
土木部		22	19	3	
	都市計画課	3	2	1	
	道路建設課	3	3	0	
	道路維持課				
	港湾課	9	9	0	
	河川課	3	3	0	
	砂防課	2	2	0	
	住宅課	2	0	2	
合計		42	29	13	

# 水産部 事業位置図

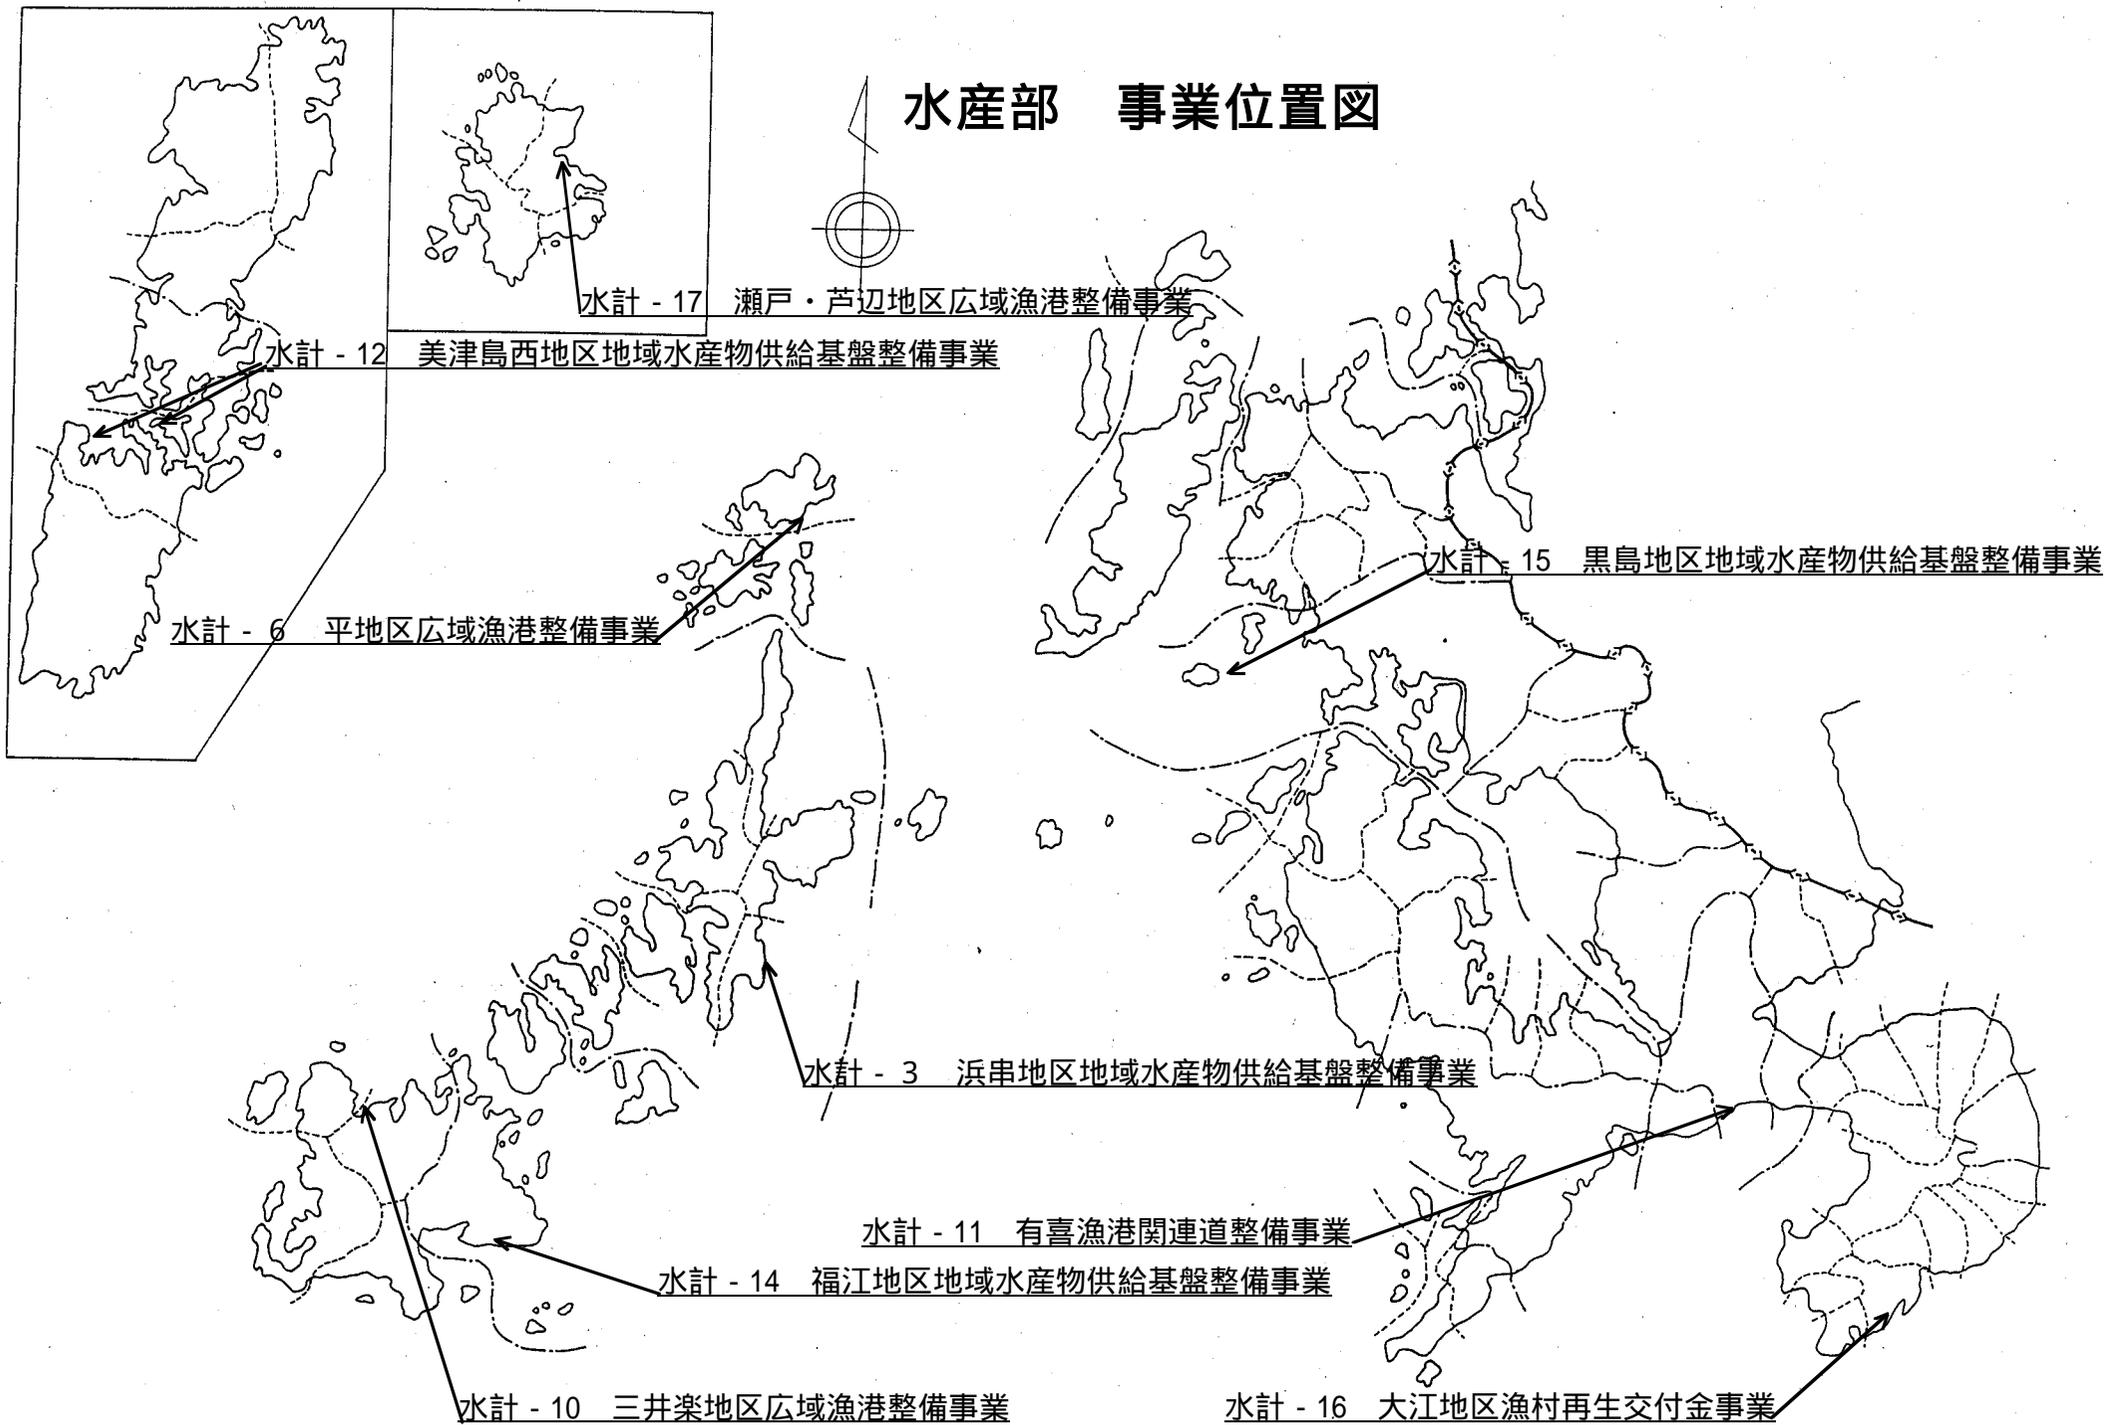

# 農林部 事業位置図

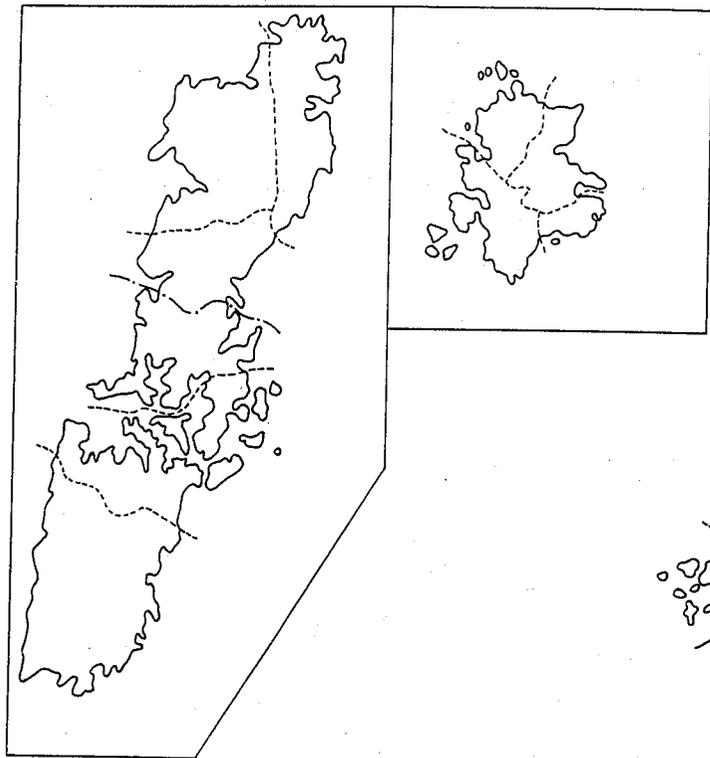

林務 - 2 森林管理道南部寺脇線 森林整備事業

林務 - 1 森林管理道翁頭線 森林整備事業


農整 - 3 三重西部地区 農免農道整備事業


農整 - 1 布津北部地区 畑地帯総合整備事業

農整 - 2 三井楽地区 畑地帯総合整備事業



農整 - 5 上登龍地区 地すべり対策事業

農整 - 4 小佐々中央地区 農免農道整備事業


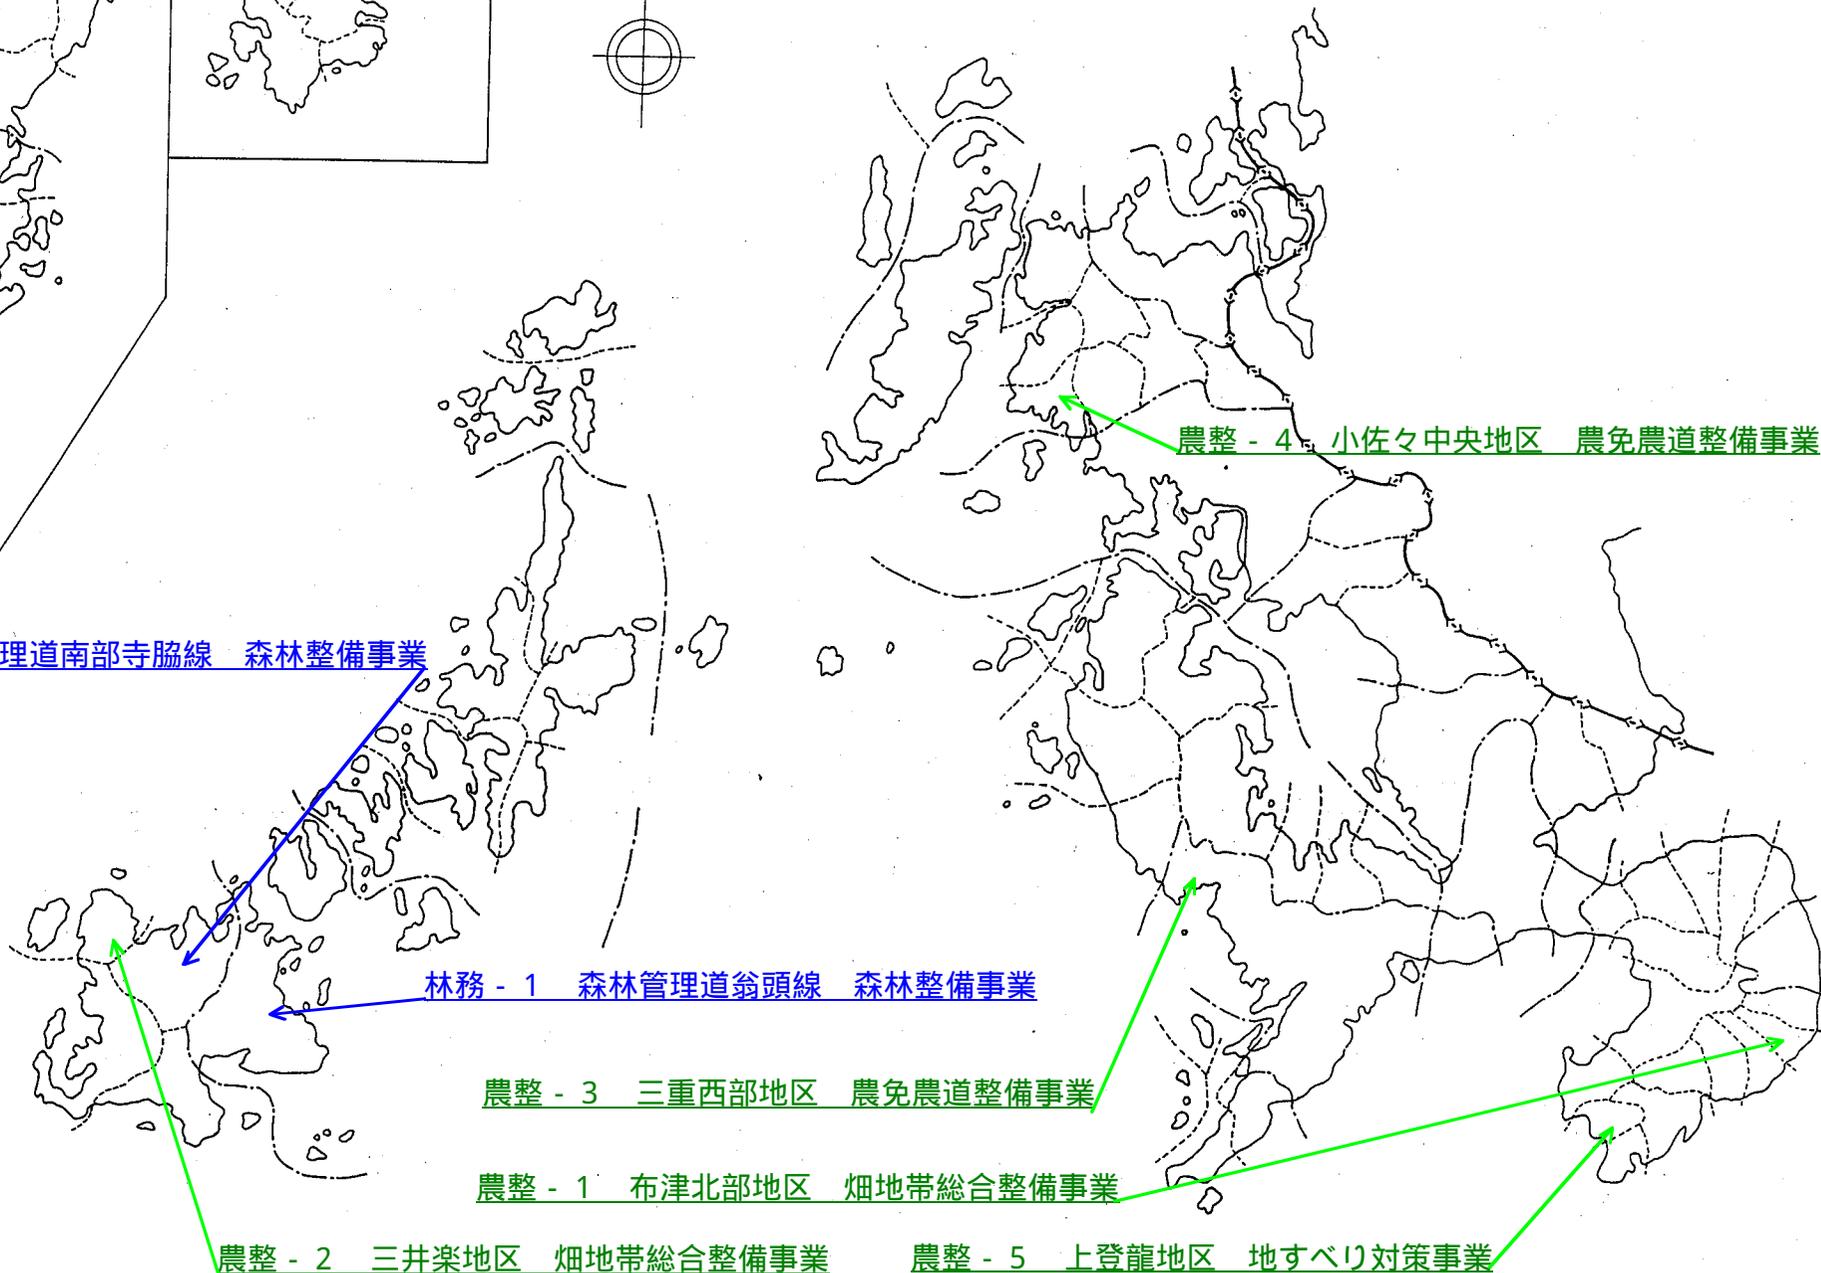


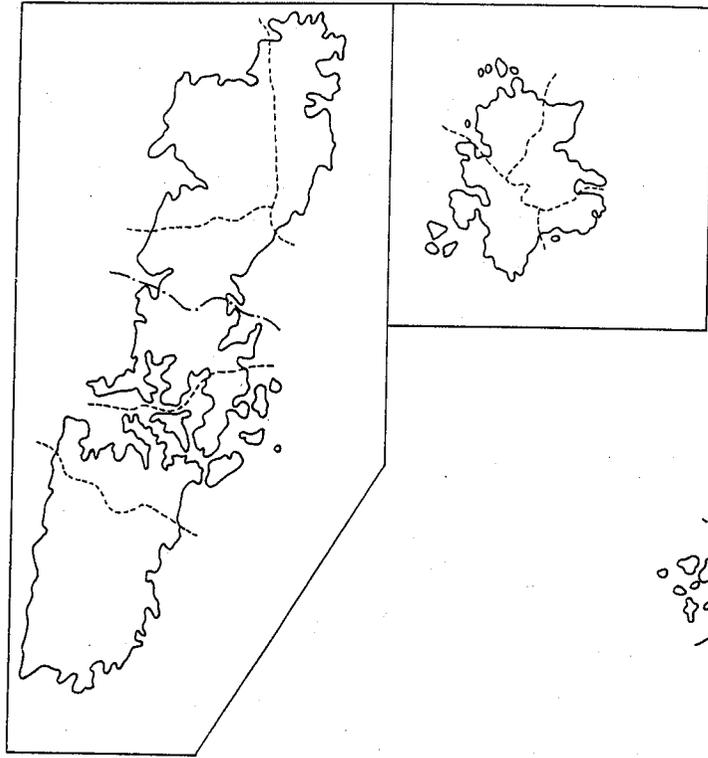



# 環境部 事業位置図

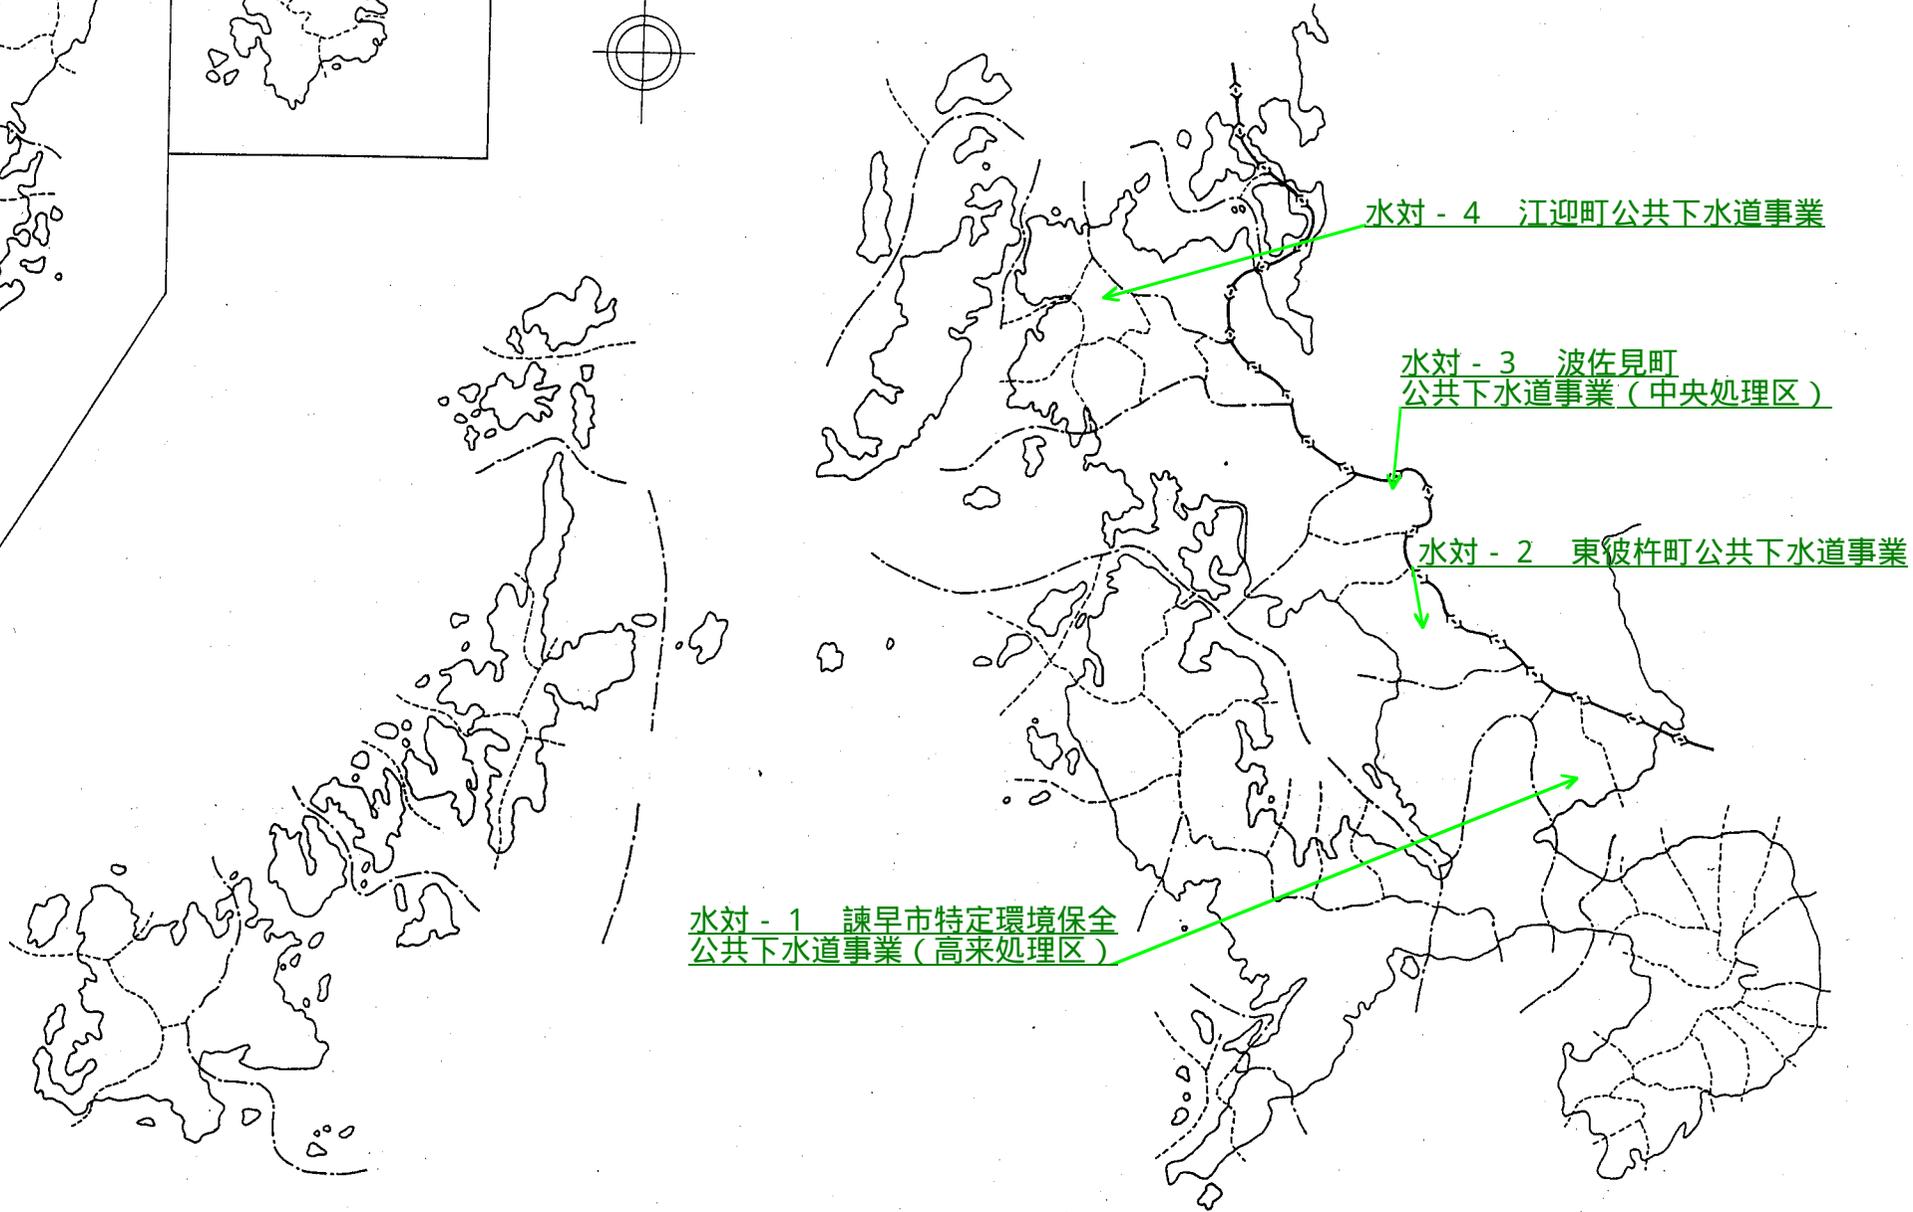

# 土木部 事業位置図

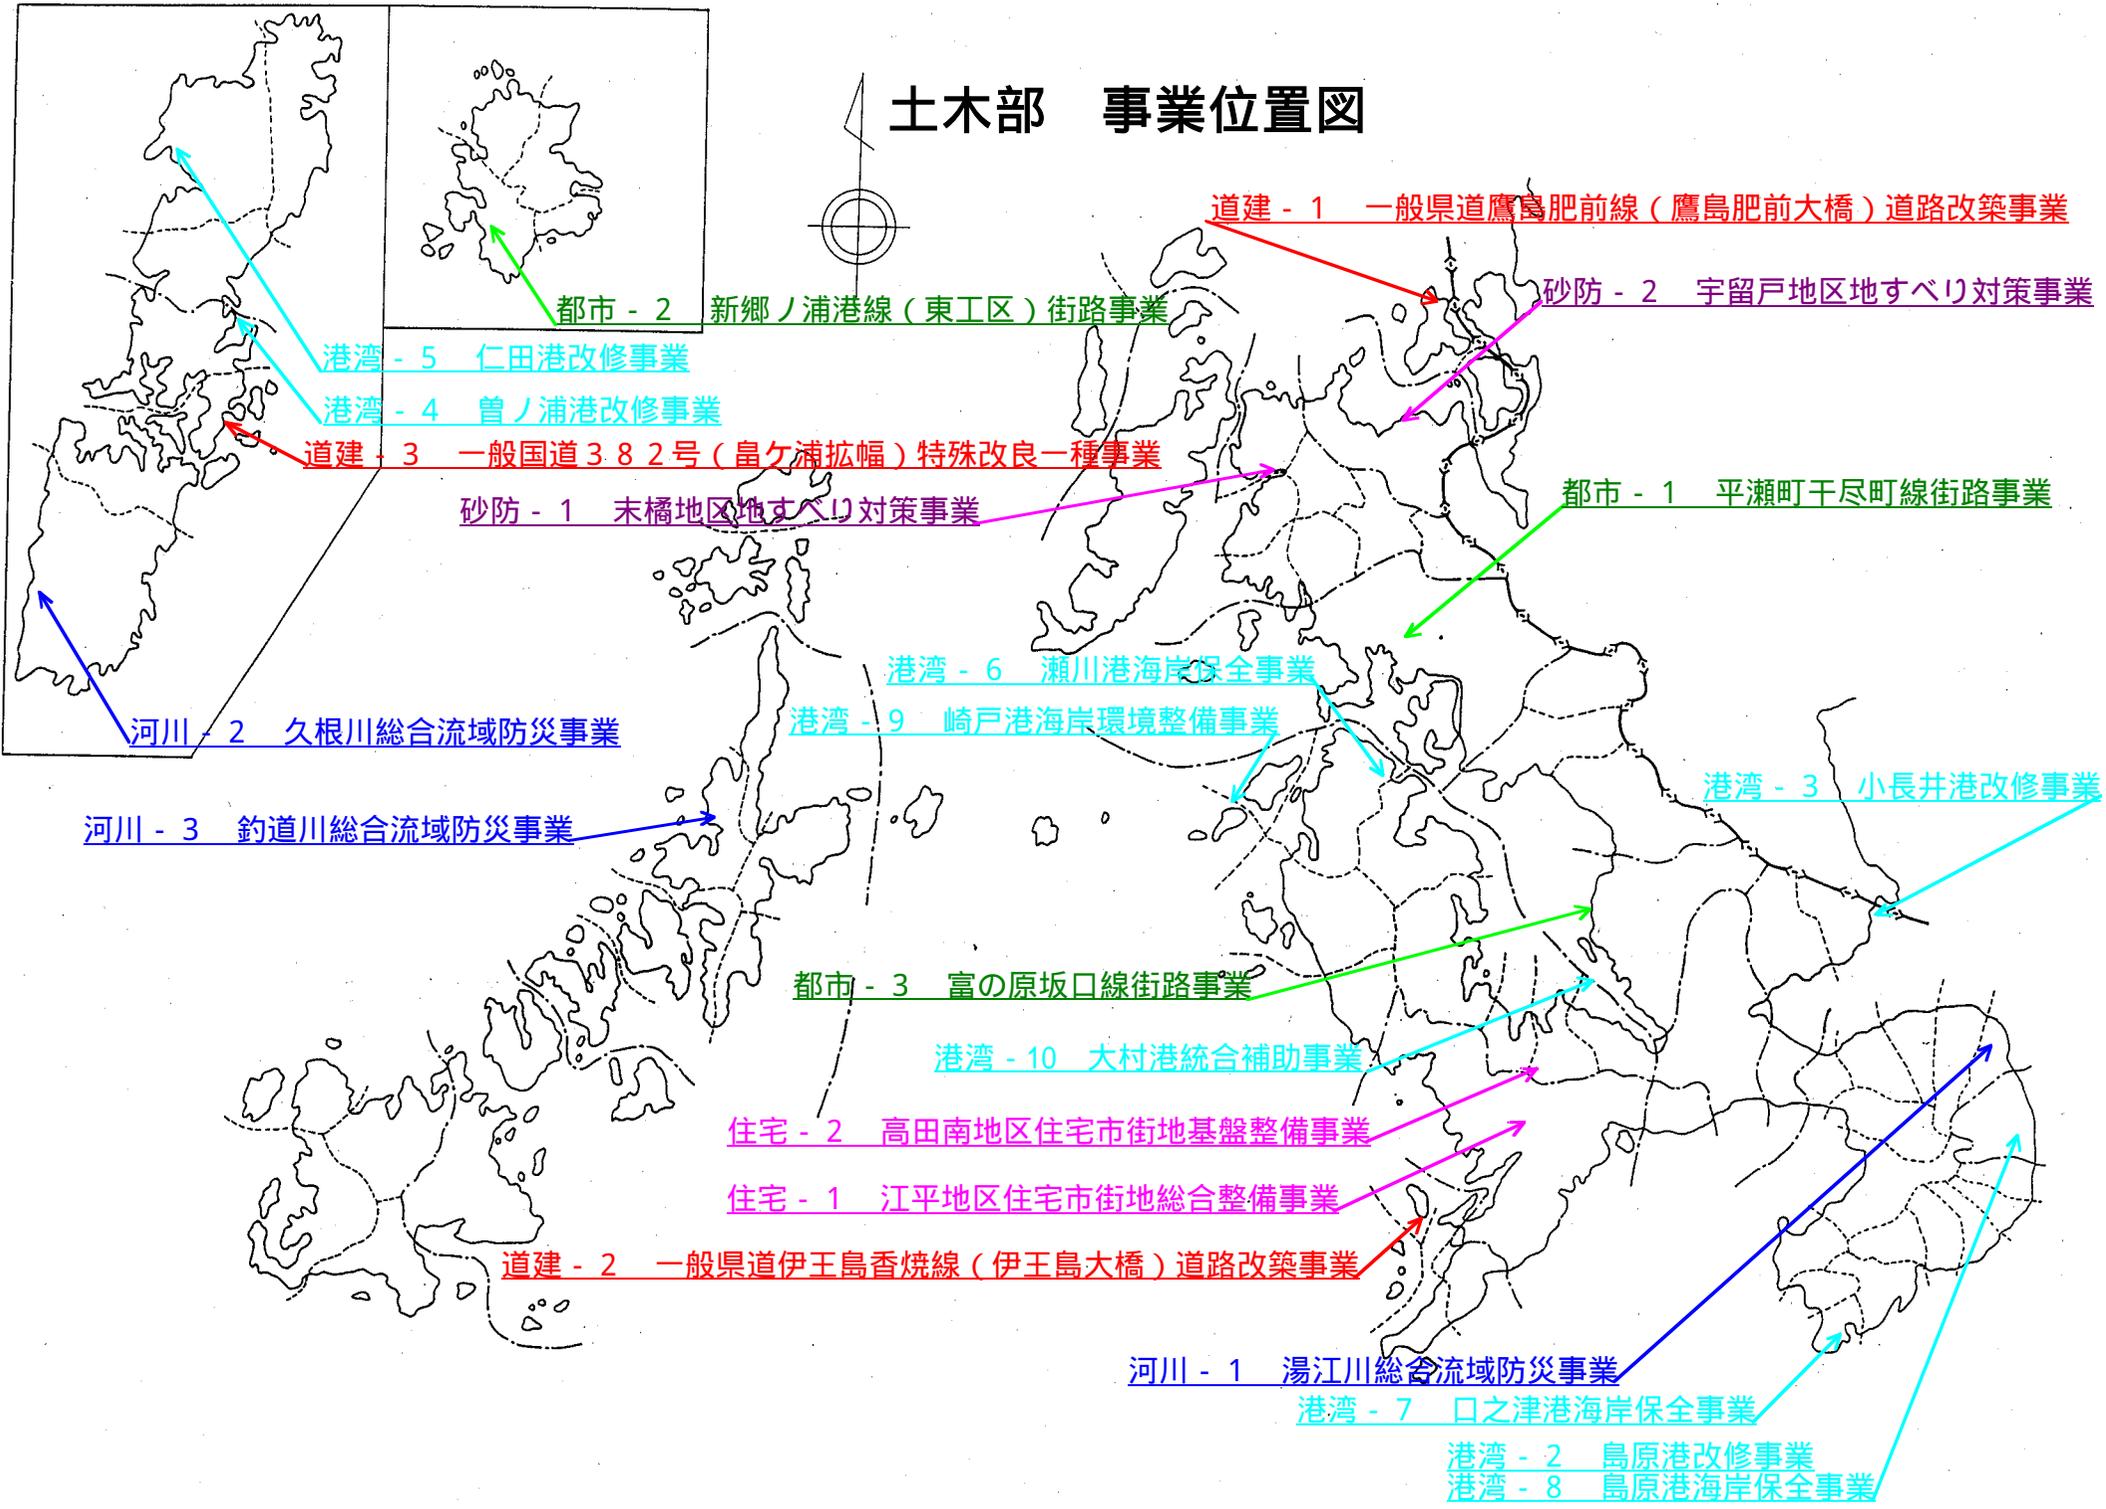


# 詳細審議事業 位置図

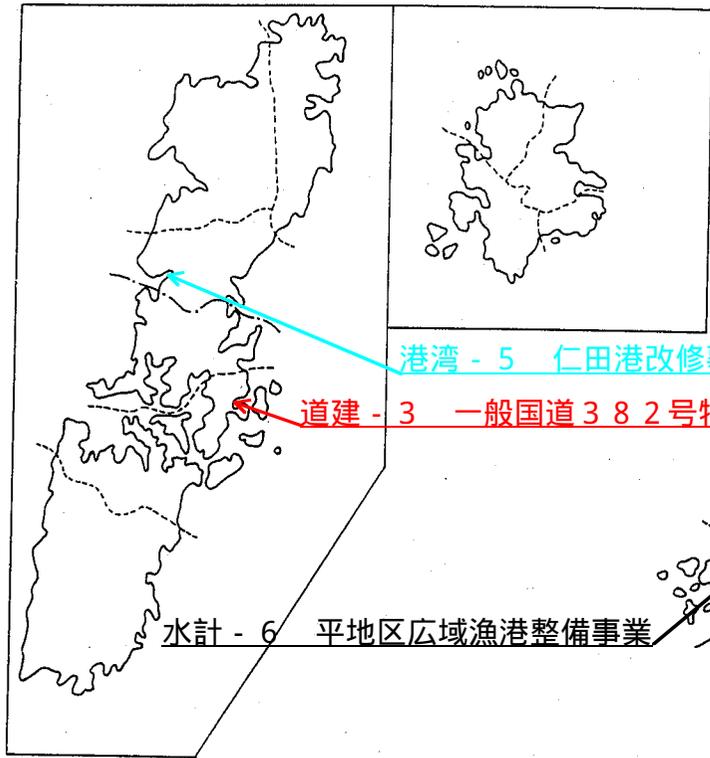

港湾 - 5 仁田港改修事業

道建 - 3 一般国道382号特殊改良一種事業(畠ヶ浦拡幅)

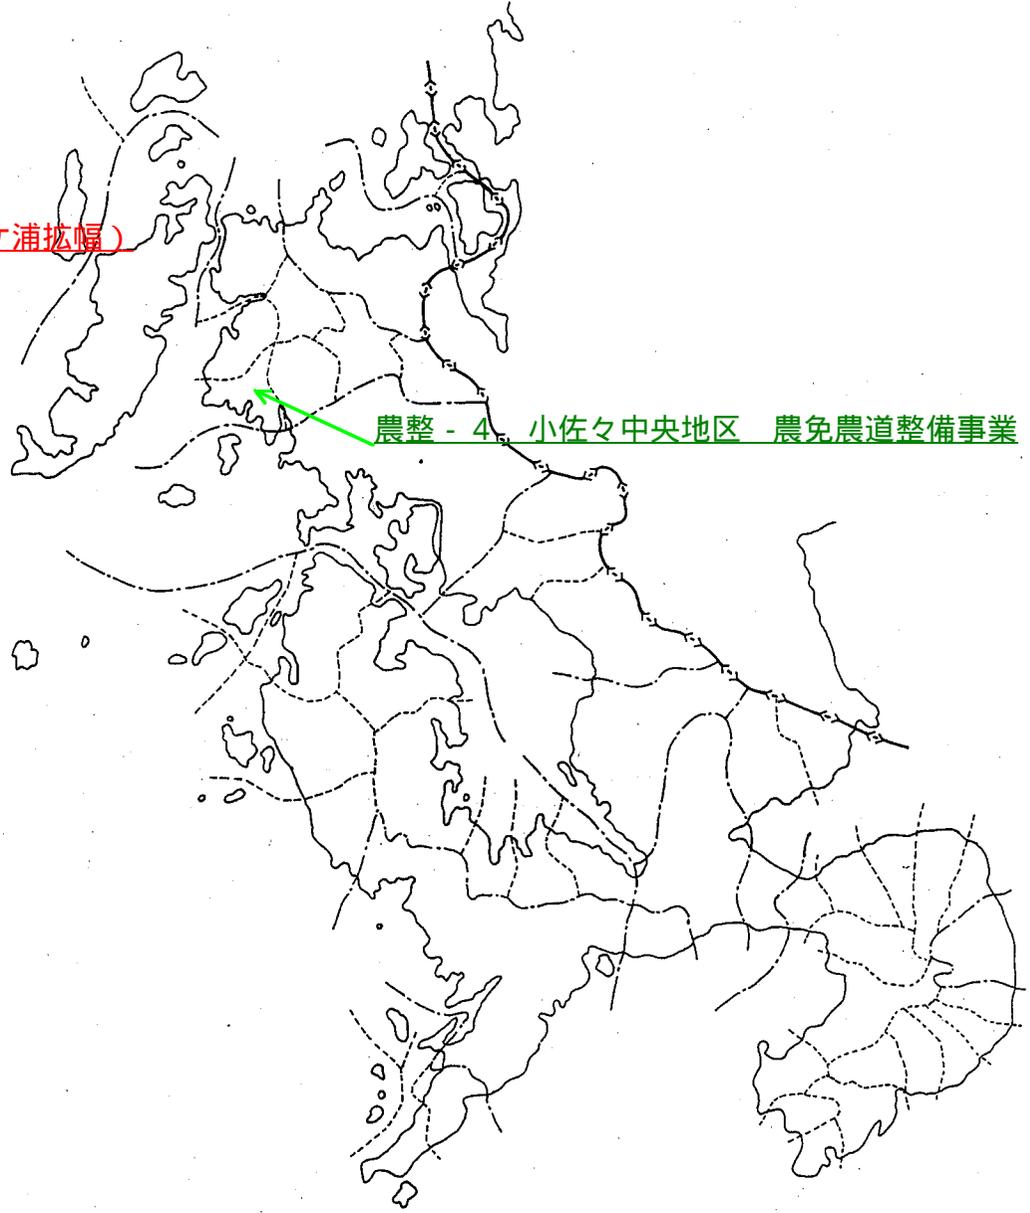

# 平成18年度 再評価対象事業一覧表

整理番号	事業計画								再評価の理由	進捗率(%)	前回審議年度	対応方針(原案)
	事業名	施設名	事業主体	事業箇所	事業概要	工期		事業費(億円)				
						着工	完了					
					上段：当初 下段：変更							
<b>農林部</b>												
<b>農村整備課</b>												
農整-1	畑地帯総合整備事業(担い手育成型)	布津北部	県	南島原市	受益面積 34ha 区画整理 34ha 畑かん 32ha	H13	H19	14.0	事業採択後5年経過	46	-	継続
						H13	H22	13.3				
農整-2	畑地帯総合整備事業(担い手育成型)	三井楽	県	五島市	受益面積 335ha 畑地かんがい 333ha 排水路工 3,260m 農道工 4,868m	H13	H20	31.7	事業採択後5年経過	54	-	継続
						H13	H20	30.6				
農整-3	農免農道整備事業	三重西部	県	長崎市	受益面積 169ha 農道工 3,040m 橋梁工 2箇所 幅員 7.0(5.5)m	H2	H16	13.5	再評価後5年経過	88	H13	継続
						H2	H19	13.4				
農整-4	農免農道整備事業	小佐々中央	県	佐世保市	受益面積 104ha 道路工 1,950m 幅員 7.0(5.5)m	H5	H23	15.8	社会経済情勢の変化	44	H10	中止
						H5	H18	15.8				
農整-5	地すべり対策事業	上登龍	県	南島原市	受益面積 158ha 受益戸数 116戸 杭打工 70本 横孔ホ-リング 54孔 排水路工 1,520m	H8	H18	3.5	再評価後5年経過	86	H13	継続
						H8	H20	4.9				
<b>林務課</b>												
林務-1	森林整備事業	森林管理道 翁頭線	県	五島市 (旧福江市)	延長 7,250m 幅員 5.0m 利用区域面積 485ha	H13	H22	16.9	事業採択後5年経過	29	-	継続
						H13	H22	15.7				

# 平成18年度 再評価対象事業一覧表

整理番号	事業計画								再評価の理由	進捗率(%)	前回審議年度	対応方針(原案)
	事業名	施設名	事業主体	事業箇所	事業概要	工期		事業費(億円)				
						着工	完了					
					上段：当初 下段：変更							
林務-2	森林整備事業	森林管理道南部寺脇線	市	五島市(旧岐宿町)	延長 4,600m 幅員 4.0m 利用区域面積 315ha	H13	H20	6.9	事業採択後5年経過	43	-	継続
						H13	H25	6.0				
<b>水産部</b>												
<b>水産基盤計画課</b>												
水計-3	地域水産物供給基盤整備事業(一般)	浜串地区(浜串漁港)	県	新上五島町	沖防波堤(灯台設置)1基 南防波堤A(改良)20m 廃止 南防波堤A(灯台撤去)1基 廃止 護岸(改良)30m O護岸(改良)47m 追加 -5m岸壁 110m -6m岸壁 60m -2m物揚場 50m 廃止 -2m物揚場(改良)44m 追加 浮棧橋 1基 -6m泊地 5,200m <sup>2</sup> -2m泊地 2,400m <sup>2</sup> 廃止 -3m泊地 900m <sup>2</sup> 追加 道路(補修)580m 道路A 180m 用地A 2,400m <sup>2</sup> 用地B 350m <sup>2</sup> 廃止 用地C 1,680m <sup>2</sup> 用地(舗装)1,630m <sup>2</sup> 追加	H14	H18	14.5	漁業情勢の急激な変化による計画の見直し	66	-	見直し継続
						H14	H21	12.3				
水計-6	広域漁港整備事業(特定)	平地区(平漁港、宇久漁場)	県	佐世保市	<平漁港> 防波堤(A)50m 廃止 防波堤(B)80m 廃止 防波堤(C)80m 防波堤(D)30m 廃止 防波堤(撤去)70m 護岸290m 廃止 突堤(移設)20m 防波堤(改良)61m 追加 護岸(改良)290m 追加 -6.5m泊地 10,000m <sup>2</sup> -6.5m岸壁(改良)145m -3.0m岸壁 300m 廃止 突堤(網取A)20m 突堤(網取B)50m 浮体式係船岸(移設)1基 浮体式係船岸(補修)1基 -3m岸壁(改良)60m 追加 -2m物揚場(改良)75m 追加 道路(A)500m 廃止 道路(B)60m 道路(C)40m 廃止 用地(A)10,000m <sup>2</sup> 廃止 用地(D)500m <sup>2</sup> <宇久漁場> 魚礁設置 0.558ha	H14	H23	35.1	漁業情勢の急激な変化による計画の見直し	44	-	見直し継続
						H14	H23	20.1				

# 平成18年度 再評価対象事業一覧表

整理 番号	事業計画								再評価の 理由	進捗率 (%)	前回 審議 年度	対応方針 (原案)
	事業名	施設名	事業 主体	事業箇所	事業概要	工 期		事業費 (億円)				
						着工	完了					
					上段：当初 下段：変更							
水計 - 10	広域漁港整備事業 (一般)	三井楽地区 (三井楽漁港)	県	五島市	三井楽地区 防波堤(改良) 70m 護岸 90m -3m泊地 1,500㎡ - 3m岸壁(A) 30m - 3m岸壁(改良) 30m 船揚場(改良) 25m 道路 117m 用地 2,900㎡ 用地(斜路) 21m 打折地区 補助突堤 50m 40m	H14	H19	9.38	漁業情勢の急 激な変化によ る計画の見直 し	87	-	見直し 継続
					H14	H20	9.00					
水計 - 11	漁港関連道整備事 業	有喜漁港	県	諫早市	道路962.7m	H8	H19	14.5	再評価後 5年経過	88	H13	継続
						H8	H20	17.2				
水計 - 12	地域水産物供給基 盤整備事業(特 定)	美津島西地区 (西海漁港) (尾崎漁港) (尾崎漁場)	市	対馬市	西海漁港 内防波堤 40m 廃止 -2m物揚場 70m 浮棧橋(改良) 1式 追加 道路 180m 用地(A) 500㎡ 用地(B) 1,600㎡ 用地(C) 1,000㎡ 尾崎漁港 沖防波堤 350m -3m岸壁(改良) 110m 用地(A) 2,000㎡ 用地(B) 2,000㎡ 用地(C) 300㎡ 尾崎漁場 着定基質 0.5ha	H14	H23	20.1	漁業情勢の急 激な変化によ る計画の見直 し	57	-	見直し 継続
						H14	H23	19.1				
水計 - 14	地域水産物供給基 盤整備事業(特 定)	福江地区 (南河原漁港、塩 津漁港、大浜漁 港、戸楽漁港)	市	五島市	<南河原漁港> 北防波堤 28m -2.5m物揚場 60m 船揚場 20m 浮棧橋 1基 道路 167m 用地 1,000㎡ <塩津漁港> 護岸(改良) 80m 沖防波堤 50m 船揚場 15m <大浜漁港> 北防波堤 40m 廃止 -2.5m泊地 1,500㎡ -2.5m航路 2,300㎡ -2.5m物揚場 140m 浮棧橋 1基 突堤 50m 用地 900㎡ 用地(水面) 2,160㎡ <戸楽漁港> 東防波堤(改良)(A) 72m 東防波堤(改良)(B) 20m 東防波堤 30m 護岸(改良) 35m	H14	H18	29.1	漁業情勢の急 激な変化によ る計画の見直 し	60	-	中止

# 平成18年度 再評価対象事業一覧表

整理番号	事業計画							再評価の理由	進捗率(%)	前回審議年度	対応方針(原案)	
	事業名	施設名	事業主体	事業箇所	事業概要	工期						事業費(億円)
						着工	完了					
					上段:当初 下段:変更							
水計 - 15	地域水産物供給基盤整備事業(一般)	黒島地区(黒島漁港)	市	佐世保市	<白馬地区> N護岸(改良) L=115m 第2沖防波堤 L=80m -3m岸壁(改良) L=178m 浮棧橋 1基 用地(改良) A=1400㎡	H14	H21	9.75	漁業情勢の急激な変化による計画の見直し	41	-	見直し継続
					-3m岸壁(改良) L=43.5m 追加 -2.5m物揚場(改良) L=38m 追加 用地(改良) A=174㎡ 追加 <串ヶ浜地区> 北防波堤 L=20m -2m物揚場 L=95m 道路 L=370m 用地 A=5,300㎡ <漁場> 魚礁設置 A=16.14ha	H14	H22	9.07				
水計 - 16	漁村再生交付金事業	大江地区(南有馬漁港)	市	南島原市南有馬町	漁業集落道路 2路線 (W=4.0m) L=280m 集落排水施設 污水管渠 L=2,567m 中継ポンプ 一式 処理施設 一式 緑地広場施設 遊歩道・植栽 A=1,700㎡ 多目的広場 A=6,600㎡ 駐車場 A=210㎡ 用地舗装 A=700㎡ 稚魚放流 一式	H8	H23	10.5	再評価後5年経過	78	H13	継続
水計 - 17	漁業集落環境整備事業	瀬戸・芦辺地区(芦辺漁港)	市	壱岐市	<芦辺漁港> 1号集落道 L=220m 2号集落道 L=120m 3号集落道 L=250m 5号集落道 L=170m 6号集落道 L=130m 追加 排水管路施設 L=23,000m 排水処理施設 1式 1号排水路 L=35m 2号排水路 L=200m 追加 照明施設 1式 緑地・広場施設 10,000㎡ 追加 用地整備(排水処理施設) 8,000㎡	H14	H23	43.1	漁業情勢の急激な変化による計画の見直し	21	-	見直し継続

# 平成18年度 再評価対象事業一覧表

整理 番号	事業計画								再評価の 理由	進捗率 (%)	前回 審議 年度	対応方針 (原案)
	事業名	施設名	事業 主体	事業箇所	事業概要	工 期		事業費 (億円)				
						着工	完了					
					上段：当初 下段：変更							
<b>環境部</b>												
<b>水環境対策課</b>												
水対 - 1	公共下水道事業	諫早市特定環境 保全公共下水道 事業(高来処理 区)	市	諫早市 (旧高来町)	計画区域 280ha 計画人口 10,000人 計画汚水量(日最大) 4,600m <sup>3</sup> /日	H9	H25	101.6	事業採択後 10年経過	47	-	継続
水対 - 2	公共下水道事業	東彼杵町公共下 水道事業	町	東彼杵町	計画区域 228ha 計画人口 5,500人 計画汚水量(日最大) 3,500m <sup>3</sup> /日	H9	H29	67.9	事業採択後 10年経過	43	-	継続
水対 - 3	公共下水道事業	波佐見町公共下 水道事業(中央処 理区)	町	波佐見町	計画区域 340ha 計画人口 11,000人 計画汚水量(日最大) 6,200m <sup>3</sup> /日	H9	H26	114.3	事業採択後 10年経過	45	-	継続
水対 - 4	公共下水道事業	江迎町公共下 水道事業	町	江迎町	計画区域 159ha 計画人口 4,700人 計画汚水量(日最大) 2,400m <sup>3</sup> /日	H9	H28	80.0	事業採択後 10年経過	62	-	継続
<b>土木部</b>												
<b>都市計画課</b>												
都市 - 1	街路事業	平瀬町干尽町線	県	佐世保市	延長 L = 2,370m 幅員 W = 40m	H9	H19	109.1	事業採択後 10年経過	72	-	継続
						H9	H24	109.1				
都市 - 2	街路事業	新郷ノ浦港線(東 工区)	県	壱岐市	道路改良 延長 L=1,400m 幅員 W=6.0(12.0)m	H9	H20	33.0	事業採択後 10年経過	63	-	継続
						H9	H22	33.0				

# 平成18年度 再評価対象事業一覧表

整理番号	事業計画								再評価の理由	進捗率(%)	前回審議年度	対応方針(原案)
	事業名	施設名	事業主体	事業箇所	事業概要	工期		事業費(億円)				
						着工	完了					
					上段：当初 下段：変更							
都市-3	街路事業	富の原坂口線	市	大村市	延長L=740m、幅員W=16m	H9	H22	28.2	事業採択後10年経過	25	-	継続
<b>道路建設課</b>												
道建-1	道路改築事業	一般県道 鷹島肥前線 鷹島肥前大橋	県	松浦市	延長=3.2km 幅員=6.0(10.0)m	H9	H20	141.5	事業採択後10年経過	59	-	継続
道建-2	道路改築事業	一般県道 伊王島香焼線 伊王島大橋	県	長崎市	延長=2.7km 幅員=6.0(10.0)m	H9	H22	111.0	事業採択後10年経過	43	-	継続
道建-3	特殊改良一種事業	一般国道382号 島ヶ浦拡幅	県	対馬市	延長=2.5km 幅員=6.0(10.0)m	H7	H19	25.0	社会経済情勢の変化による事業規模の見直し	48	H16	見直し継続(完了)
						H7	H18	13.0				
<b>港湾課</b>												
港湾-2	島原港改修事業	小型船だまり整備	県	島原市	【当初】 防波堤 延長150m 防波堤(波除) 延長75m 泊地(-2.0m) 面積6,470㎡ 物揚場(-2.0m)延長235m(浮棧橋含む) 物揚場(-2.0m)(改良) 延長90m 道路 延長780m、幅員6m ふ頭用地 面積6,500㎡	S62	H16	14.3	再評価後5年経過	89	H13	見直し継続
				【変更】 防波堤 延長150m 防波堤(波除) 延長75m 泊地(-2.0m) 面積1,310㎡ 物揚場(-2.0m)延長235m(浮棧橋削除) 物揚場(-2.0m)(改良) 延長90m 道路 延長780m、幅員6m ふ頭用地 面積6,500㎡	S62	H21	14.9					

# 平成18年度 再評価対象事業一覧表

整理番号	事業計画								再評価の理由	進捗率(%)	前回審議年度	対応方針(原案)
	事業名	施設名	事業主体	事業箇所	事業概要	工期		事業費(億円)				
						着工	完了					
上段：当初 下段：変更												
港湾-3	小長井港改修事業	国内物流ターミナル整備	県	諫早市	防波堤 延長220m 泊地(-4.5m) 面積37,000m <sup>2</sup> 泊地(-4.5m)法止 延長143m	H2	H17	4.7	再評価後5年経過	31	H13	継続
						H2	H20	11.1				
港湾-4	曾ノ浦港改修事業	小型船だまり整備	県	対馬市	防波堤 延長150m 物揚場(-3.0m) 延長180m 道路 460m、幅員4m ぶ頭用地 面積3,300m <sup>2</sup>	H4	H15	22.1	再評価後5年経過	85	H13	継続
						H4	H20	27.6				
港湾-5	仁田港改修事業	小型船だまり整備	県	対馬市	物揚場(-3.0m) 延長120m 物揚場(-2.0m) 延長100m 浮桟橋 1基 船揚場 延長10m 泊地(-2.0m) 面積12,748m <sup>2</sup> 道路(改良) 延長1,040m、幅員5.5m 道路(A) 延長65m、幅員5.5m ぶ頭用地 面積7,300m <sup>2</sup>	H1	H16	19.6	再評価後5年経過	93	H13	継続
						H1	H20	23.2				
港湾-6	瀬川港海岸保全事業	護岸整備	県	西海市	護岸(改良) 719m	S62	H23	31.3	再評価後5年経過	74	H13	継続
						S62	H22	18.1				
港湾-7	口ノ津港海岸保全事業	護岸整備	県	南島原市	護岸(補強) 1285m 樋門(改良) 1基	S62	H22	20.3	再評価後5年経過	54	H13	継続
						S62	H28	25.4				
港湾-8	島原港海岸保全事業	護岸整備	県	島原市	護岸(補強) 575m 護岸(改良) 272m 胸壁 92m	S61	H19	36.9	再評価後5年経過	95	H13	継続
						S61	H20	36.1				
港湾-9	崎戸港海岸環境整備事業	海岸環境整備	県	西海市	【当初】 突堤 2基 離岸堤 100m 潜堤 110m 遊歩道 5,400m <sup>2</sup> 遊歩道(A) 240m <sup>2</sup> 護岸(改良) 491m 護岸 60m 植栽 1,800m <sup>2</sup> 人工海浜 84,000m <sup>3</sup>	H9	H23	24.9	事業採択後10年経過	62	-	見直し継続
						H9	H23	22.2				
					【変更】 突堤 2基 離岸堤 100m 潜堤 110m 遊歩道 5,400m <sup>2</sup> 護岸(改良) 520m 植栽 4,500m <sup>2</sup> 人工海浜 56,000m <sup>3</sup>							

# 平成18年度 再評価対象事業一覧表

整理番号	事業計画								再評価の理由	進捗率(%)	前回審議年度	対応方針(原案)
	事業名	施設名	事業主体	事業箇所	事業概要	工期		事業費(億円)				
						着工	完了					
					上段：当初 下段：変更							
港湾-10	大村港統合補助事業	馬場崎地区係留提整備	県	大村市	【当初】 浮棧橋 4基 突堤 1式 陸置場 2,230m <sup>2</sup> 駐車場 1,200m <sup>2</sup> 斜路 10m トイレ 1箇所 【変更】 浮棧橋 4基 係留堤 235m 陸置場 2,230m <sup>2</sup> 駐車場 1,200m <sup>2</sup> 斜路 10m トイレ 1箇所	H11	H20	6.6	社会経済情勢の変化	56	-	見直し継続
<b>河川課</b>												
河川-1	総合流域防災事業	湯江川水系湯江川	県	島原市	L=1,200m 河床掘削、低水護岸、橋梁架替え、堰改築	H4	H18	10.9	再評価後5年経過	32	H13	継続
						H4	H23	10.9				
河川-2	総合流域防災事業	久根川水系久根川	県	対馬市	L=2,200m 河道拡幅に伴う河床掘削、護岸整備、橋梁架替等	H4	H20	33.0	再評価後5年経過	53	H13	継続
						H4	H25	33.0				
河川-3	総合流域防災事業	釣道川水系釣道川	県	新上五島町	L=1,450m 河道拡幅に伴う、河床掘削、築堤、護岸整備、橋梁架替等	H4	H20	24.5	再評価後5年経過	62	H13	継続
						H4	H25	29.9				
<b>砂防課</b>												
砂防-1	地すべり対策事業	末橋	県	江迎町	集水井工 7基 集水ホ-リング 7,300m 排水ホ-リング 338m 横ホ-リング 4,200m 杭打工 288本 アンカ-工 109本 法面工 6,000m <sup>2</sup>	H9	H25	14.2	事業採択後10年経過	38	-	見直し継続
					集水井工 7基 集水ホ-リング 7,685m 排水ホ-リング 453m 横ホ-リング 4,500m 杭打工 210本 アンカ-工 80本 法面工 4,000m <sup>2</sup>	H9	H24	11.3				

# 平成18年度 再評価対象事業一覧表

整理番号	事業計画									再評価の理由	進捗率(%)	前回審議年度	対応方針(原案)	
	事業名	施設名	事業主体	事業箇所	事業概要	工期		事業費(億円)						
						着工	完了							
					上段：当初 下段：変更									
砂防-2	地すべり対策事業	宇留戸	県	松浦市	集水井工 4基 杭打工 183本	集水ホ-リング 4,600m アンカー工 130本	横ホ-リング 6,100m	H9	H20	15.0	事業採択後 10年経過	48	-	見直し 継続
					集水井工 5基 杭打工 273本	集水ホ-リング 4,710m アンカー工 71本	横ホ-リング 4,720m	H9	H26	9.0				
<b>住宅課</b>														
住宅-1	住宅市街地総合整備事業	江平地区	市	長崎市	道路、公園の整備 老朽建築物の除却	コミュニティ住宅の建設 建て替え促進等	H9	H18	18.6	事業採択後 10年経過	53	-	継続	
							H9	H23	18.6					
住宅-2	高田南地区 住宅市街地基盤整備事業	< 区画整理事業 > 高田線 道ノ尾駅前線	町	長与町	A = 49.8ha 建物移転 257戸 高田線 延長250m幅員16m 道ノ尾駅前線 延長130m幅員12m	H9	H17	6.6	事業採択後 10年経過	45	H15	継続		
						H9	H20	16.2						
