




平成21年度

長崎県公共事業評価監視委員会意見書

平成21年9月3日

長崎県公共事業評価監視委員会

委員長 園田 圭介



## 平成21年度長崎県公共事業評価監視委員会意見書

### 1. 意見

諮問があった再評価対象24事業及び事後評価対象5事業については、いずれも対応方針（原案）どおり認めることに決定しましたので、答申します。

### 2. 審議過程における意見

#### 1) 個別の事業について

##### 【再評価対象事業】

##### ・万葉地区地域水産物供給基盤整備事業

現状、漁獲量及び漁船数は減少傾向にあり、現在の活用状況にあわせて船揚場等の一部施設を縮小する計画の見直しは妥当と認められる。

今後、更なる水産業の衰退を招かないよう後継者対策や既存施設の活用に取り組まれるよう要望する。

##### ・東長崎平間・東地区土地区画整理事業

当地区において良質な住環境を整備するため、道路等の公共施設整備を含めた事業であり、必要性は認識する。

一方、地価の下落や都心部への回帰傾向など社会情勢が大きく変化している現状を踏まえ、今後整備のあり方について再度検討し、地域の意向を十分聞いた上で、見直しの必要があれば再審議を行うことを付帯条件に継続の方針を認める。

##### ・郡川広域河川改修事業

関係者との調整に時間を要しているが、早期完成を図るため、効率的な事業執行に努められたい。

- ・畑地帯総合整備事業 大苑地区

地区内の遺跡調査により事業が長期化しているが、農業の振興のために、事業の早期完成に努められたい。

【事後評価対象事業】

- ・長池三会線街路事業

当路線の整備により、国道251号の渋滞緩和や通学路としての安全が確保されたなど整備効果が現れている。

2) その他

新規事業の採択にあたっては、地域の実情や将来の財政負担を見据えた上で計画されたい。

3. 平成21年度の審議経過

- ・第1回委員会（平成21年7月13日開催）

再評価及び事後評価対象事業の説明及び審議

現地調査箇所の選定

- ・第2回委員会（平成21年8月3日、4日開催）

現地調査、再評価及び事後評価詳細審議事業の選定

- ・第3回委員会（平成21年8月24日開催）

再評価詳細審議事業の審議

事後評価詳細審議事業の審議

注) 詳細審議事業の選定に際して配慮した事項

計画見直し等がある事業

事業進捗が遅れている事業

## 平成21年度 再評価対象事業数一覧


| 担当部 | 担当課    | 対象事業数 | 県事業 | 市町村事業 | 備考 |
|-----|--------|-------|-----|-------|----|
| 水産部 |        | 3     | 2   | 1     |    |
|     | 漁港漁場課  | 3     | 2   | 1     |    |
| 農林部 |        | 6     | 5   | 1     |    |
|     | 農村整備課  | 3     | 3   | 0     |    |
|     | 林務課    | 3     | 2   | 1     |    |
| 環境部 |        | 1     | 0   | 1     |    |
|     | 水環境対策課 | 1     | 0   | 1     |    |
| 土木部 |        | 14    | 8   | 6     |    |
|     | 都市計画課  | 2     | 0   | 2     |    |
|     | 道路建設課  | 0     | 0   | 0     |    |
|     | 道路維持課  | 0     | 0   | 0     |    |
|     | 港湾課    | 3     | 3   | 0     |    |
|     | 河川課    | 4     | 3   | 1     |    |
|     | 砂防課    | 2     | 2   | 0     |    |
|     | 住宅課    | 3     | 0   | 3     |    |
| 合計  |        | 24    | 15  | 9     |    |

# 水産部 事業位置図(再評価)




# 農林部 事業位置図(再評価)


(別記5)

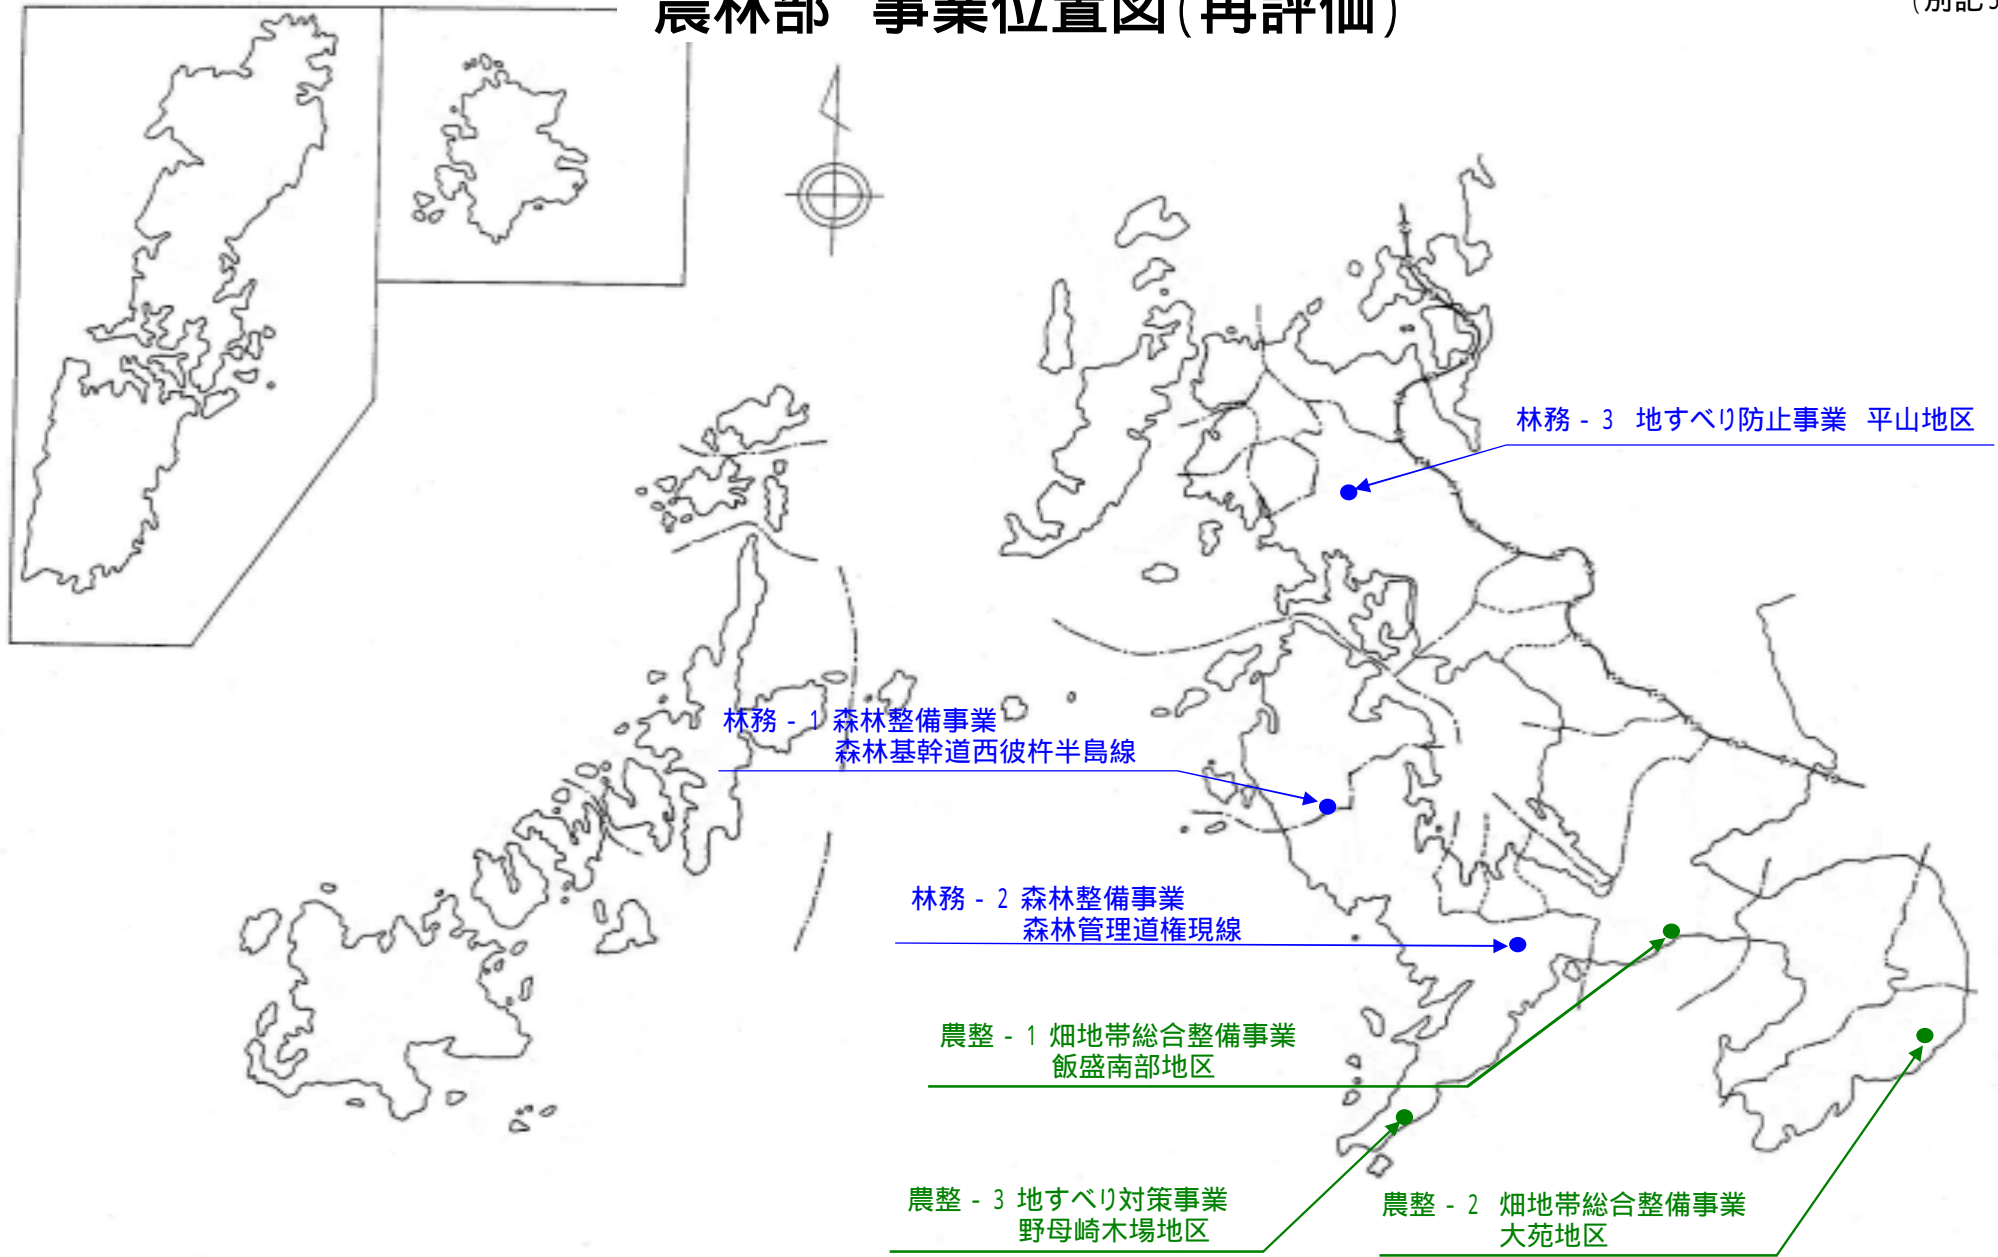

# 環境部 事業位置図(再評価)

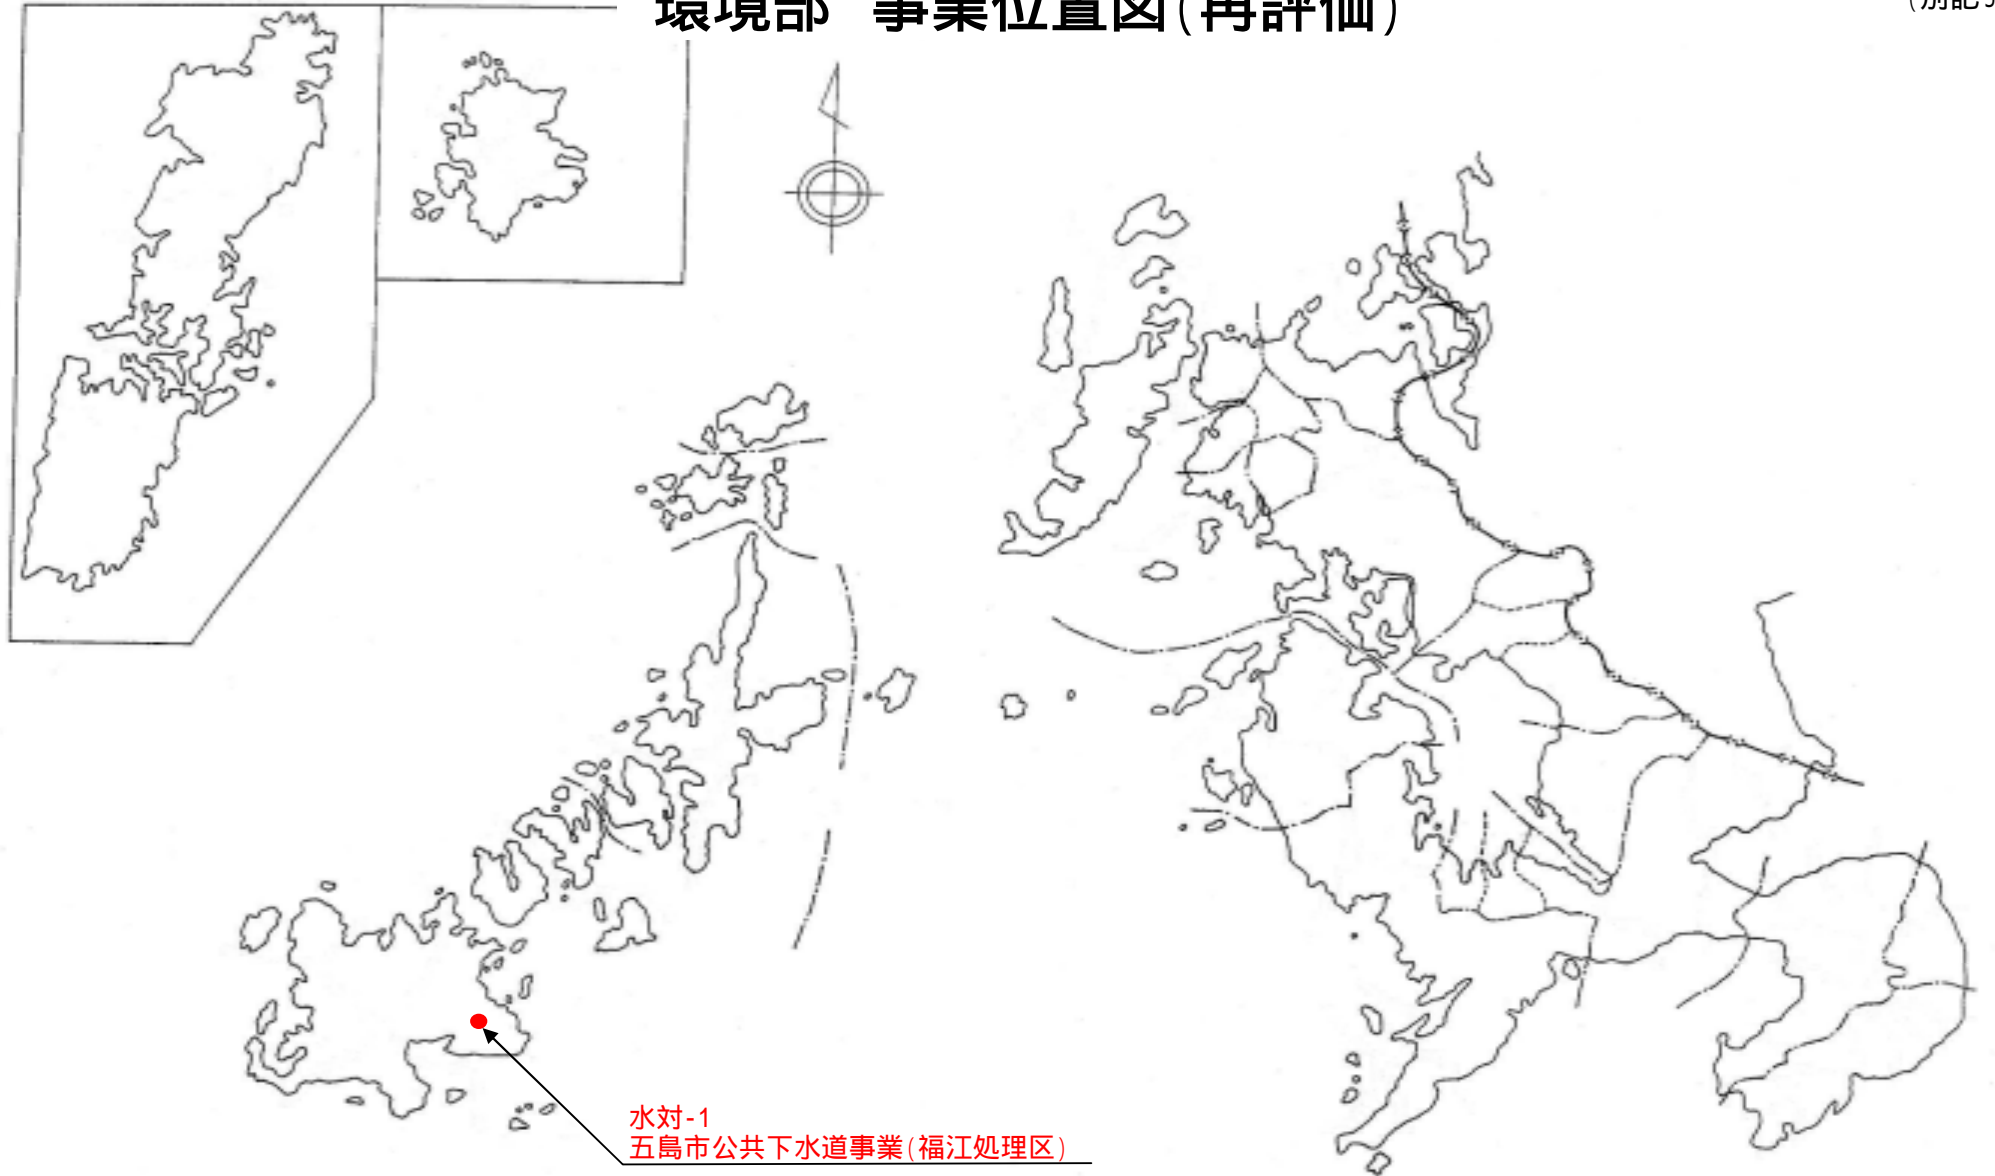

# 土木部 事業位置図(再評価)

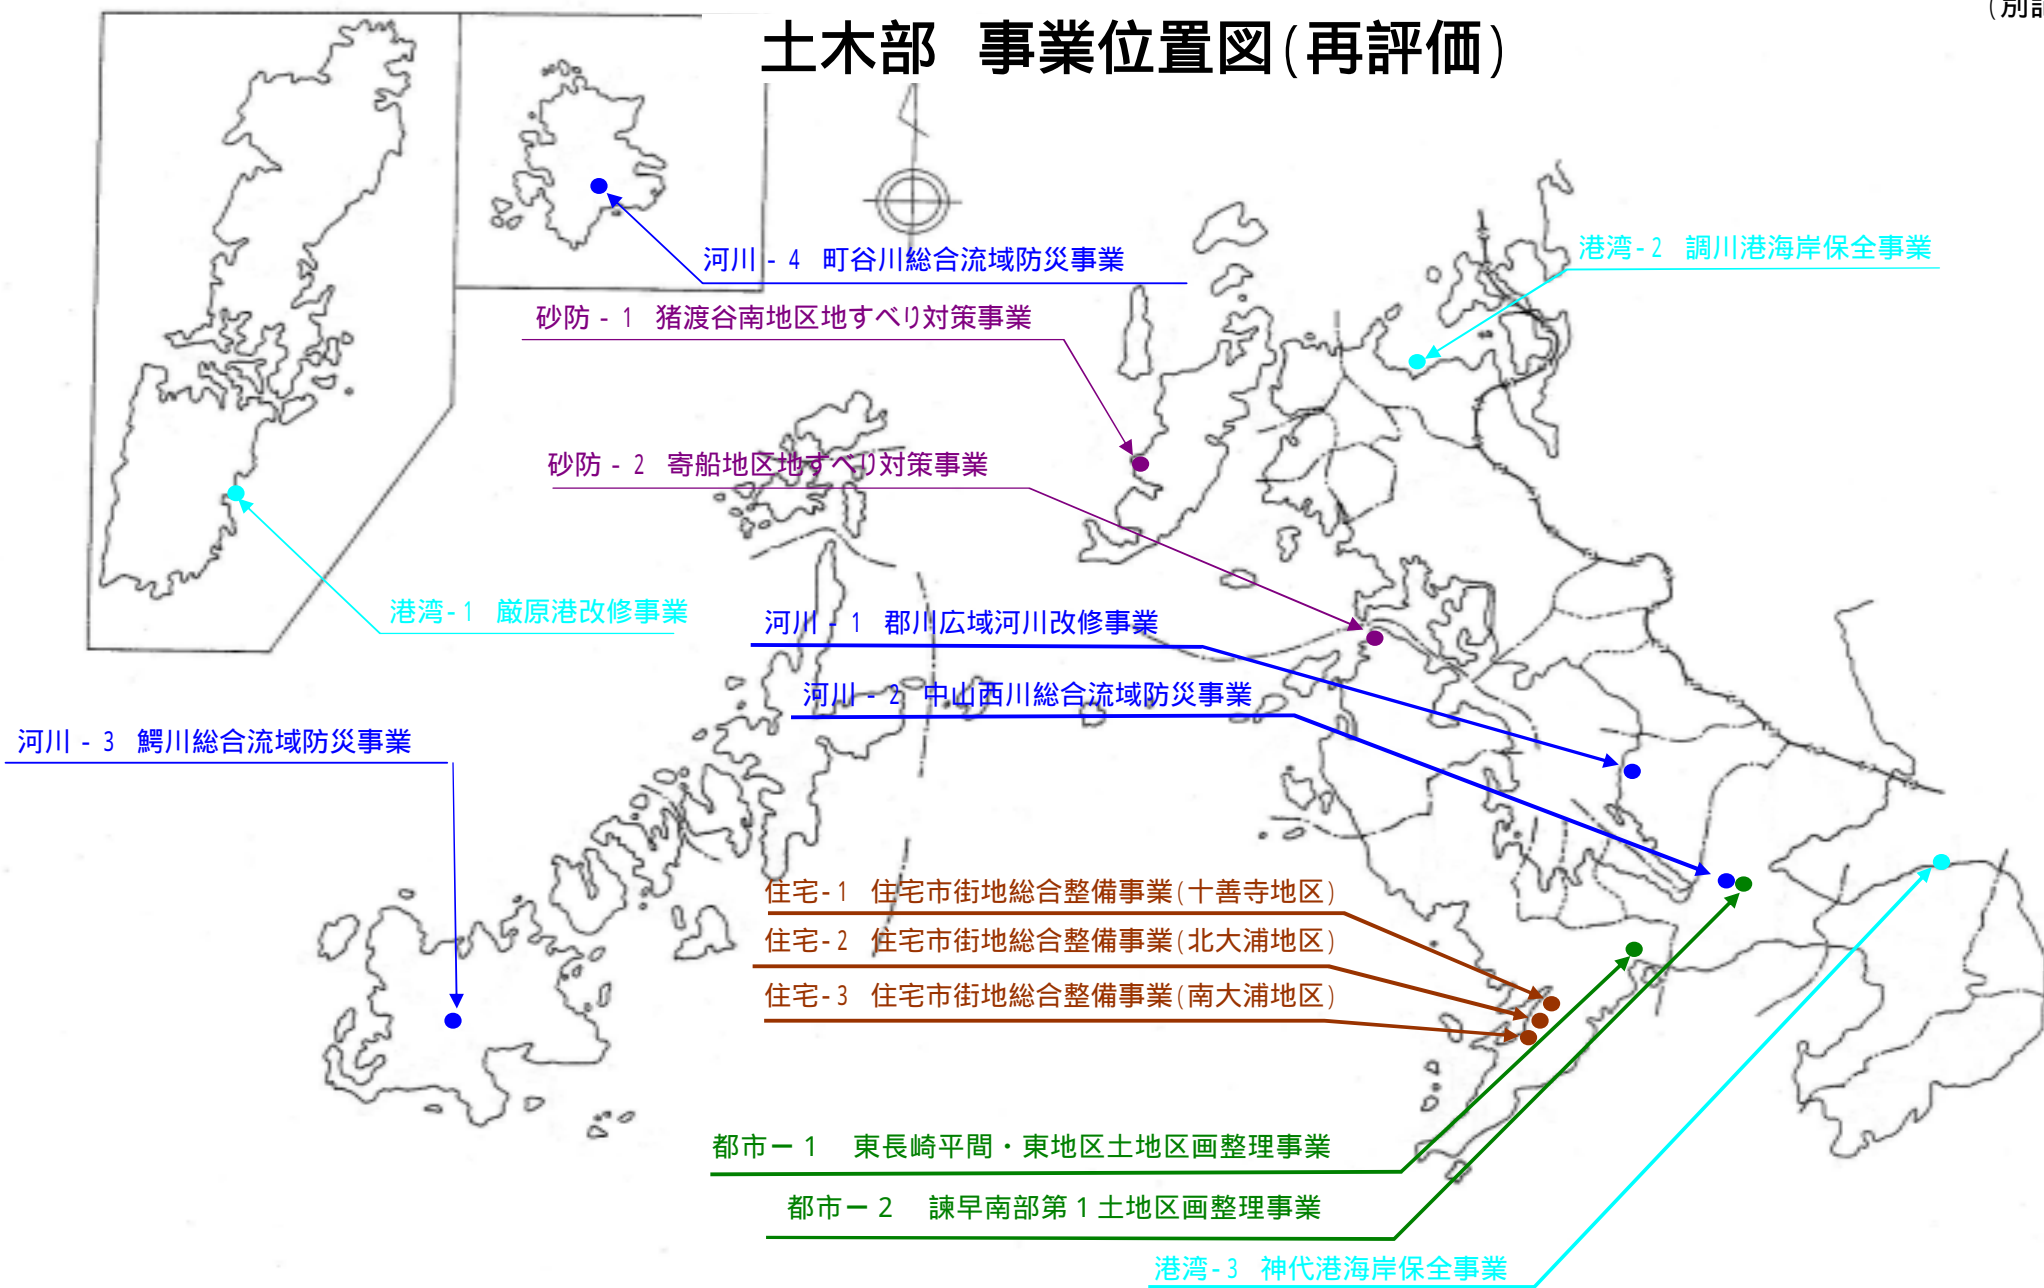



# 平成21年度 再評価対象事業一覧表

| 整理番号         | 事業計画             |                |      |      |  |     |      | 再評価の理由 | 進捗率(%)       | 前回審議年度 | 対応方針(原案) |         |
|--------------|------------------|----------------|------|------|--|-----|------|--------|--------------|--------|----------|---------|
|              | 事業名              | 施設名            | 事業主体 | 事業箇所 | 事業概要   | 工期  |      |        |              |        |          | 事業費(億円) |
|              |                  |                |      |      |  | 着工  | 完了   |        |              |        |          |         |
|              |                  |                |      |      | 上段：当初 下段：変更  |     |      |        |              |        |          |         |
| <b>水産部</b>   |                  |                |      |      |  |     |      |        |              |        |          |         |
| <b>漁港漁場課</b> |                  |                |      |      |  |     |      |        |              |        |          |         |
| 漁港<br>-1     | 広域漁港整備事業<br>(特定) | 芦辺地区<br>(芦辺漁港) | 県    | 吉崎市  | <瀬戸地区><br>瀬戸防波堤(A)(改良) 110m<br>内防波堤(I)(改良) 70m<br>内防波堤(G)(改良) 90m<br>9,500m <sup>2</sup><br>-2m泊地 4,750m <sup>3</sup><br>4,000m <sup>2</sup><br>-7m航路 8,000m <sup>3</sup><br>-5m岸壁(補修) 104m<br>-6m岸壁(改良) 100m<br>-3m岸壁 70m<br>浮棧橋(I) 1基<br>浮棧橋(IV)(移設) 1基<br>-3m岸壁(C)(改良) 50m<br>-3m岸壁(G)(改良) 210m<br>瀬戸物揚場(改良) 100m<br>-3m岸壁(H)(改良) 122m<br>突堤(D)(改良) 50m<br>突堤(E)(改良) 50m<br>船揚場(改良) 60m<br><芦辺地区><br>内防波堤(K) 50m<br>内防波堤(B)(改良) 80m<br>内防波堤(C)(改良) 80m<br>内防波堤(L)(改良) 40m<br>護岸(I)(改良) 150m<br>-2m物揚場(改良) 80m<br>浮棧橋(III) 1基<br>-2m物揚場(改良) 240m | H14 | H23  | 21.9   | 再評価後<br>5年経過 | 48.4   | H16      | 継続      |
|              |                  |                |      |      | H14  | H23 | 21.9 |        |              |        |          |         |

# 平成21年度 再評価対象事業一覧表

| 整理<br>番号 | 事業計画             |                  |          |       |  |     |     | 再評価の<br>理由 | 進捗率<br>(%)   | 前回<br>審議<br>年度 | 対応方針<br>(原案) |             |
|----------|------------------|------------------|----------|-------|--|-----|-----|------------|--------------|----------------|--------------|-------------|
|          | 事業名              | 施設名              | 事業<br>主体 | 事業箇所  | 事業概要   | 工 期 |     |            |              |                |              | 事業費<br>(億円) |
|          |                  |                  |          |       |  | 着工  | 完了  |            |              |                |              |             |
|          |                  |                  |          |       | 上段：当初 下段：変更  |     |     |            |              |                |              |             |
| 漁港<br>-2 | 広域漁港整備事業<br>(特定) | 奈良尾地区<br>(奈良尾漁港) | 県        | 新上五島町 | <奈良尾地区><br>内防波堤(A) 15m<br>内防波堤(B) 15m<br>浮棧橋(D) 1基<br>用地(舗装) 2,050㎡  | H14 | H23 | 56.2       | 再評価後<br>5年経過 | 65.0           | H16          | 継続          |
|          |                  |                  |          |       | <小奈良尾地区><br>防波堤(改良) 105m<br>内防波堤(C) 90m<br>沖防波堤(改良) 300m<br>浮棧橋(B)(改良) 1基<br>浮棧橋(C) 1基<br>-5m岸壁(改良) 50m<br>道路(A)改良 792m<br>道路(C)補修 180m<br><福見地区><br>内防波堤 100m<br>-2m泊地 1,430㎡ | H14 | H23 | 56.2       |              |                |              |             |

# 平成21年度 再評価対象事業一覧表

| 整理<br>番号 | 事業計画                      |  |          |      |   |     |     | 再評価の<br>理由 | 進捗率<br>(%)                      | 前回<br>審議<br>年度 | 対応方針<br>(原案) |             |
|----------|---------------------------|--|----------|------|---|-----|-----|------------|---------------------------------|----------------|--------------|-------------|
|          | 事業名                       | 施設名  | 事業<br>主体 | 事業箇所 | 事業概要  | 工期  |     |            |                                 |                |              | 事業費<br>(億円) |
|          |                           |  |          |      |   | 着工  | 完了  |            |                                 |                |              |             |
|          |                           |  |          |      | 上段：当初 下段：変更   |     |     |            |                                 |                |              |             |
| 漁港<br>-3 | 地域水産物供給基<br>盤整備事業<br>(特定) | 万葉地区<br>(塩水漁港<br>波砂間漁港<br>貝津漁港<br>嵯峨島漁港<br>貝津漁場) | 市        | 五島市  | (塩水漁港)<br>沖防波堤 85m→50m<br>西防波堤 20m<br>導流堤 95m<br>-1m泊地 300㎡<br>-2m泊地 500㎡<br>-3.5m航路 5,000㎡<br>船揚場 30m<br>用地水面(-4m) 4,000㎡<br>用地(舗装) 0㎡→2,049㎡<br>(波砂間漁港)<br>内防波堤 18m→廃止<br>-3m航路 1,600㎡<br>道路 110m→廃止<br>用地水面(-4m) 6,000㎡→3,300㎡<br>用地護岸 80m→廃止<br>用地 1,500㎡→廃止<br>(貝津漁港)<br>西防波堤 60m<br>西防波堤(改良) 220m<br>内防波堤 25m<br>-1m航路 5,100㎡→廃止<br>浮棧橋 1基<br>船揚場 30m→廃止<br>(嵯峨島漁港)<br>外防波堤(改良) 165m<br>-3m泊地 1,700㎡→廃止<br>-2m泊地 1,900㎡<br>突堤 60m<br>-2m物揚場 50m<br>浮棧橋 1基<br>道路 570m<br>用地 6,000㎡<br>用地護岸 80m<br>(貝津漁場)<br>増殖施設 0.8ha | H14 | H22 | 40.7       | 漁業情勢の<br>急激な変化<br>による計画の<br>見直し | 96.1           | -            | 見直し<br>継続   |
|          |                           |  |          |      |   |     |     | H14        |                                 |                |              |             |

# 平成21年度 再評価対象事業一覧表

| 整理番号          | 事業計画              |                   |      |            |   |     |     |         | 再評価の理由         | 進捗率(%) | 前回審議年度 | 対応方針(原案) |
|---------------|-------------------|-------------------|------|------------|---|-----|-----|---------|----------------|--------|--------|----------|
|               | 事業名               | 施設名               | 事業主体 | 事業箇所       | 事業概要  | 工期  |     | 事業費(億円) |                |        |        |          |
|               |                   |                   |      |            |   | 着工  | 完了  |         |                |        |        |          |
| 上段：当初 下段：変更   |                   |                   |      |            |   |     |     |         |                |        |        |          |
| <b>農林部</b>    |                   |                   |      |            |   |     |     |         |                |        |        |          |
| <b>農村整備課</b>  |                   |                   |      |            |   |     |     |         |                |        |        |          |
| 農整-1          | 畑地帯総合整備事業(担い手育成型) | 飯盛南部地区            | 県    | 諫早市        | 受益面積 A=182ha<br>区画整理 A=181ha<br>畑地かんがい A=132ha                    | H11 | H22 | 62.4    | 事業採択後<br>10年経過 | 90     | -      | 継続       |
|               |                   |                   |      |            |   | H11 | H22 | 63.3    |                |        |        |          |
| 農整-2          | 畑地帯総合整備事業(担い手育成型) | 大苑地区              | 県    | 南島原市       | 受益面積 A=39ha<br>区画整理 A=34ha<br>畑地かんがい A=28ha                       | H11 | H19 | 18.5    | 再評価後<br>5年経過   | 87     | H16    | 継続       |
|               |                   |                   |      |            |   | H11 | H23 | 14.8    |                |        |        |          |
| 農整-3          | 地すべり対策事業          | 野母崎木場地区           | 県    | 長崎市        | 水路工L=592m<br>集水井工n=8基<br>水抜ホ-リング工N=156孔<br>杭打工N=255本              | S59 | H18 | 8.5     | 再評価後<br>5年経過   | 97     | H16    | 継続       |
|               |                   |                   |      |            |   | S59 | H22 | 9.7     |                |        |        |          |
| <b>林務課</b>    |                   |                   |      |            |   |     |     |         |                |        |        |          |
| 林務-1          | 森林整備事業            | 森林基幹道<br>西彼杵半島線   | 県    | 長崎市<br>西海市 | 延長 40,800m<br>幅員 5.0~7.0m<br>利用区域森林面積 4,267ha                     | H7  | H26 | 216.0   | 再評価後<br>5年経過   | 86     | H16    | 継続       |
|               |                   |                   |      |            |   | H7  | H26 | 216.0   |                |        |        |          |
| 林務-2          | 森林整備事業            | 森林管理道<br>権現線      | 市    | 長崎市        | 延長 3,550m<br>幅員 4.0m<br>利用区域森林面積 106a                             | H11 | H22 | 5.3     | 再評価後<br>5年経過   | 63     | H16    | 継続       |
|               |                   |                   |      |            |   | H11 | H28 | 6.2     |                |        |        |          |
| 林務-3          | 平山地区地すべり<br>防止事業  | 地すべり防止施設          | 県    | 佐世保市       | ずい道工2,543.5m、集水井工33基、杭打工121本(2145.4m)、浸透<br>防止工12.6ha、排土工250,400㎡ | S38 | H19 | 54.7    | 再評価後<br>5年経過   | 91     | H15    | 継続       |
|               |                   |                   |      |            |   | S38 | H26 | 65.5    |                |        |        |          |
| <b>環境部</b>    |                   |                   |      |            |   |     |     |         |                |        |        |          |
| <b>水環境対策課</b> |                   |                   |      |            |   |     |     |         |                |        |        |          |
| 水対-1          | 公共下水道事業           | 五島市公共下水道事業(福江処理区) | 市    | 五島市        | 計画区域 約591ha<br>計画人口 17,000人<br>計画汚水量(日最大)<br>9,300㎡/日             | H17 | H46 | 208.4   | 事業採択後<br>5年未着手 | 0.0    | -      | 継続       |
|               |                   |                   |      |            |   | H17 | H54 | 206.5   |                |        |        |          |

# 平成21年度 再評価対象事業一覧表


| 整理番号         | 事業計画      |                   |      |      |  |     |     |         | 再評価の理由     | 進捗率(%) | 前回審議年度 | 対応方針(原案) |
|--------------|-----------|-------------------|------|------|--|-----|-----|---------|------------|--------|--------|----------|
|              | 事業名       | 施設名               | 事業主体 | 事業箇所 | 事業概要   | 工期  |     | 事業費(億円) |            |        |        |          |
|              |           |                   |      |      |  | 着工  | 完了  |         |            |        |        |          |
| 上段:当初 下段:変更  |           |                   |      |      |  |     |     |         |            |        |        |          |
| <b>土木部</b>   |           |                   |      |      |  |     |     |         |            |        |        |          |
| <b>都市計画課</b> |           |                   |      |      |  |     |     |         |            |        |        |          |
| 都市-1         | 土地区画整理事業  | 東長崎平間・東地区土地区画整理事業 | 市    | 長崎市  | 施行面積:58.8ha<br>建物移転:348戸<br>宅地整地:215,000m <sup>2</sup><br>道路:18,430m | H12 | H23 | 151.0   | 事業採択後10年経過 | 22     | -      | 継続       |
|              |           |                   |      |      |  | H12 | H23 | 151.0   |            |        |        |          |
| 都市-2         | 土地区画整理事業  | 諫早南部第1土地区画整理事業    | 市    | 諫早市  | 施行面積:7.5ha<br>建物移転:231戸<br>宅地整地:51,455m <sup>2</sup><br>道路:2,532m    | H7  | H20 | 88.9    | 再評価後5年経過   | 96     | H16    | 継続       |
|              |           |                   |      |      |  | H7  | H23 | 93.6    |            |        |        |          |
| <b>港湾課</b>   |           |                   |      |      |  |     |     |         |            |        |        |          |
| 港湾-1         | 厳原港改修事業   | 厳原地区臨港道路整備        | 県    | 対馬市  | 道路(A) 240m<br>道路(B) 820m<br>道路(C) 340m                               | H7  | H20 | 30.0    | 再評価後5年経過   | 49     | H16    | 継続       |
|              |           |                   |      |      |  | H7  | H24 | 36.5    |            |        |        |          |
| 港湾-2         | 調川港海岸保全事業 | 護岸整備              | 県    | 松浦市  | 護岸(改良) 978m  | H12 | H17 | 5.7     | 事業採択後10年経過 | 86     | -      | 継続       |
|              |           |                   |      |      |  | H12 | H22 | 6.5     |            |        |        |          |
| 港湾-3         | 神代港海岸保全事業 | 護岸整備              | 県    | 雲仙市  | 護岸(改良) 550m  | H12 | H19 | 4.5     | 事業採択後10年経過 | 74     | -      | 継続       |
|              |           |                   |      |      |  | H12 | H22 | 4.6     |            |        |        |          |
| <b>河川課</b>   |           |                   |      |      |  |     |     |         |            |        |        |          |
| 河川-1         | 広域河川改修事業  | 郡川                | 県    | 大村市  | 改修延長 L=8,970m<br>河道拡幅、護岸整備、橋梁架替、堰改築等                                 | H9  | H28 | 59.3    | 再評価後5年経過   | 13.8   | H16    | 継続       |
|              |           |                   |      |      |  | H9  | H35 | 59.3    |            |        |        |          |
| 河川-2         | 総合流域防災事業  | 中山西川              | 県    | 諫早市  | 改修延長 L=1,600m<br>河道拡幅、築堤、護岸整備、橋梁架替等                                  | H2  | H22 | 38.5    | 再評価後5年経過   | 84.8   | H16    | 継続       |
|              |           |                   |      |      |  | H2  | H27 | 41.5    |            |        |        |          |
| 河川-3         | 総合流域防災事業  | 鱒川                | 県    | 五島市  | 改修延長 L=950m<br>河道拡幅、護岸整備、橋梁架替等                                       | H15 | H21 | 12.0    | 再評価後5年経過   | 40.0   | H16    | 継続       |
|              |           |                   |      |      |  | H15 | H26 | 12.0    |            |        |        |          |
| 河川-4         | 総合防災流域事業  | 町谷川               | 市    | 壱岐市  | 改修延長 L=2,516m<br>河道拡幅、護岸整備、橋梁架替等                                     | H12 | H25 | 6.0     | 事業採択後10年経過 | 55.0   | -      | 継続       |
|              |           |                   |      |      |  | H12 | H29 | 6.0     |            |        |        |          |

# 平成21年度 再評価対象事業一覧表

| 整理番号        | 事業計画            |       |      |      |  |     |     |         | 再評価の理由         | 進捗率(%) | 前回審議年度 | 対応方針(原案) |
|-------------|-----------------|-------|------|------|--|-----|-----|---------|----------------|--------|--------|----------|
|             | 事業名             | 施設名   | 事業主体 | 事業箇所 | 事業概要   | 工期  |     | 事業費(億円) |                |        |        |          |
|             |                 |       |      |      |  | 着工  | 完了  |         |                |        |        |          |
| 上段：当初 下段：変更 |                 |       |      |      |  |     |     |         |                |        |        |          |
| <b>砂防課</b>  |                 |       |      |      |  |     |     |         |                |        |        |          |
| 砂防-1        | 地すべり対策事業        | 猪渡谷南  | 県    | 平戸市  | 集水井工 2基<br>集水ボーリング工 27本<br>排水ボーリング工 2本<br>横ボーリング工 192本<br>杭工 329本<br>アンカー工 40本 | H7  | H21 | 6.0     | 再評価後<br>5年経過   | 57.9   | H16    | 継続       |
|             |                 |       |      |      |  | H7  | H26 | 6.2     |                |        |        |          |
| 砂防-2        | 地すべり対策事業        | 寄船    | 県    | 西海市  | 集水井工 N=4基<br>排水ボーリング工 N=4本<br>集水ボーリング工 N=62本<br>横ボーリング工 N=42本<br>杭工 N=172本     | H7  | H17 | 4.6     | 再評価後<br>5年経過   | 68.4   | H16    | 継続       |
|             |                 |       |      |      |  | H7  | H22 | 8.0     |                |        |        |          |
| <b>住宅課</b>  |                 |       |      |      |  |     |     |         |                |        |        |          |
| 住宅-1        | 住宅市街地<br>総合整備事業 | 十善寺地区 | 市    | 長崎市  | 道路・公園の整備、共同住宅の建設、老朽住宅の除却等  | H7  | H19 | 23.4    | 再評価後<br>5年経過   | 64     | H16    | 継続       |
|             |                 |       |      |      |  | H7  | H26 | 36.2    |                |        |        |          |
| 住宅-2        | 住宅市街地<br>総合整備事業 | 北大浦地区 | 市    | 長崎市  | 道路・公園の整備、共同住宅の建設、老朽住宅の除却等  | H12 | H21 | 43.5    | 事業採択後<br>10年経過 | 22     | -      | 継続       |
|             |                 |       |      |      |  | H12 | H26 | 43.5    |                |        |        |          |
| 住宅-3        | 住宅市街地<br>総合整備事業 | 南大浦地区 | 市    | 長崎市  | 道路・公園の整備、共同住宅の建設、老朽住宅の除却等  | H12 | H21 | 35.7    | 事業採択後<br>10年経過 | 28     | -      | 継続       |
|             |                 |       |      |      |  | H12 | H26 | 35.7    |                |        |        |          |

# 土木部 事業位置図(事後評価)

(別記5)

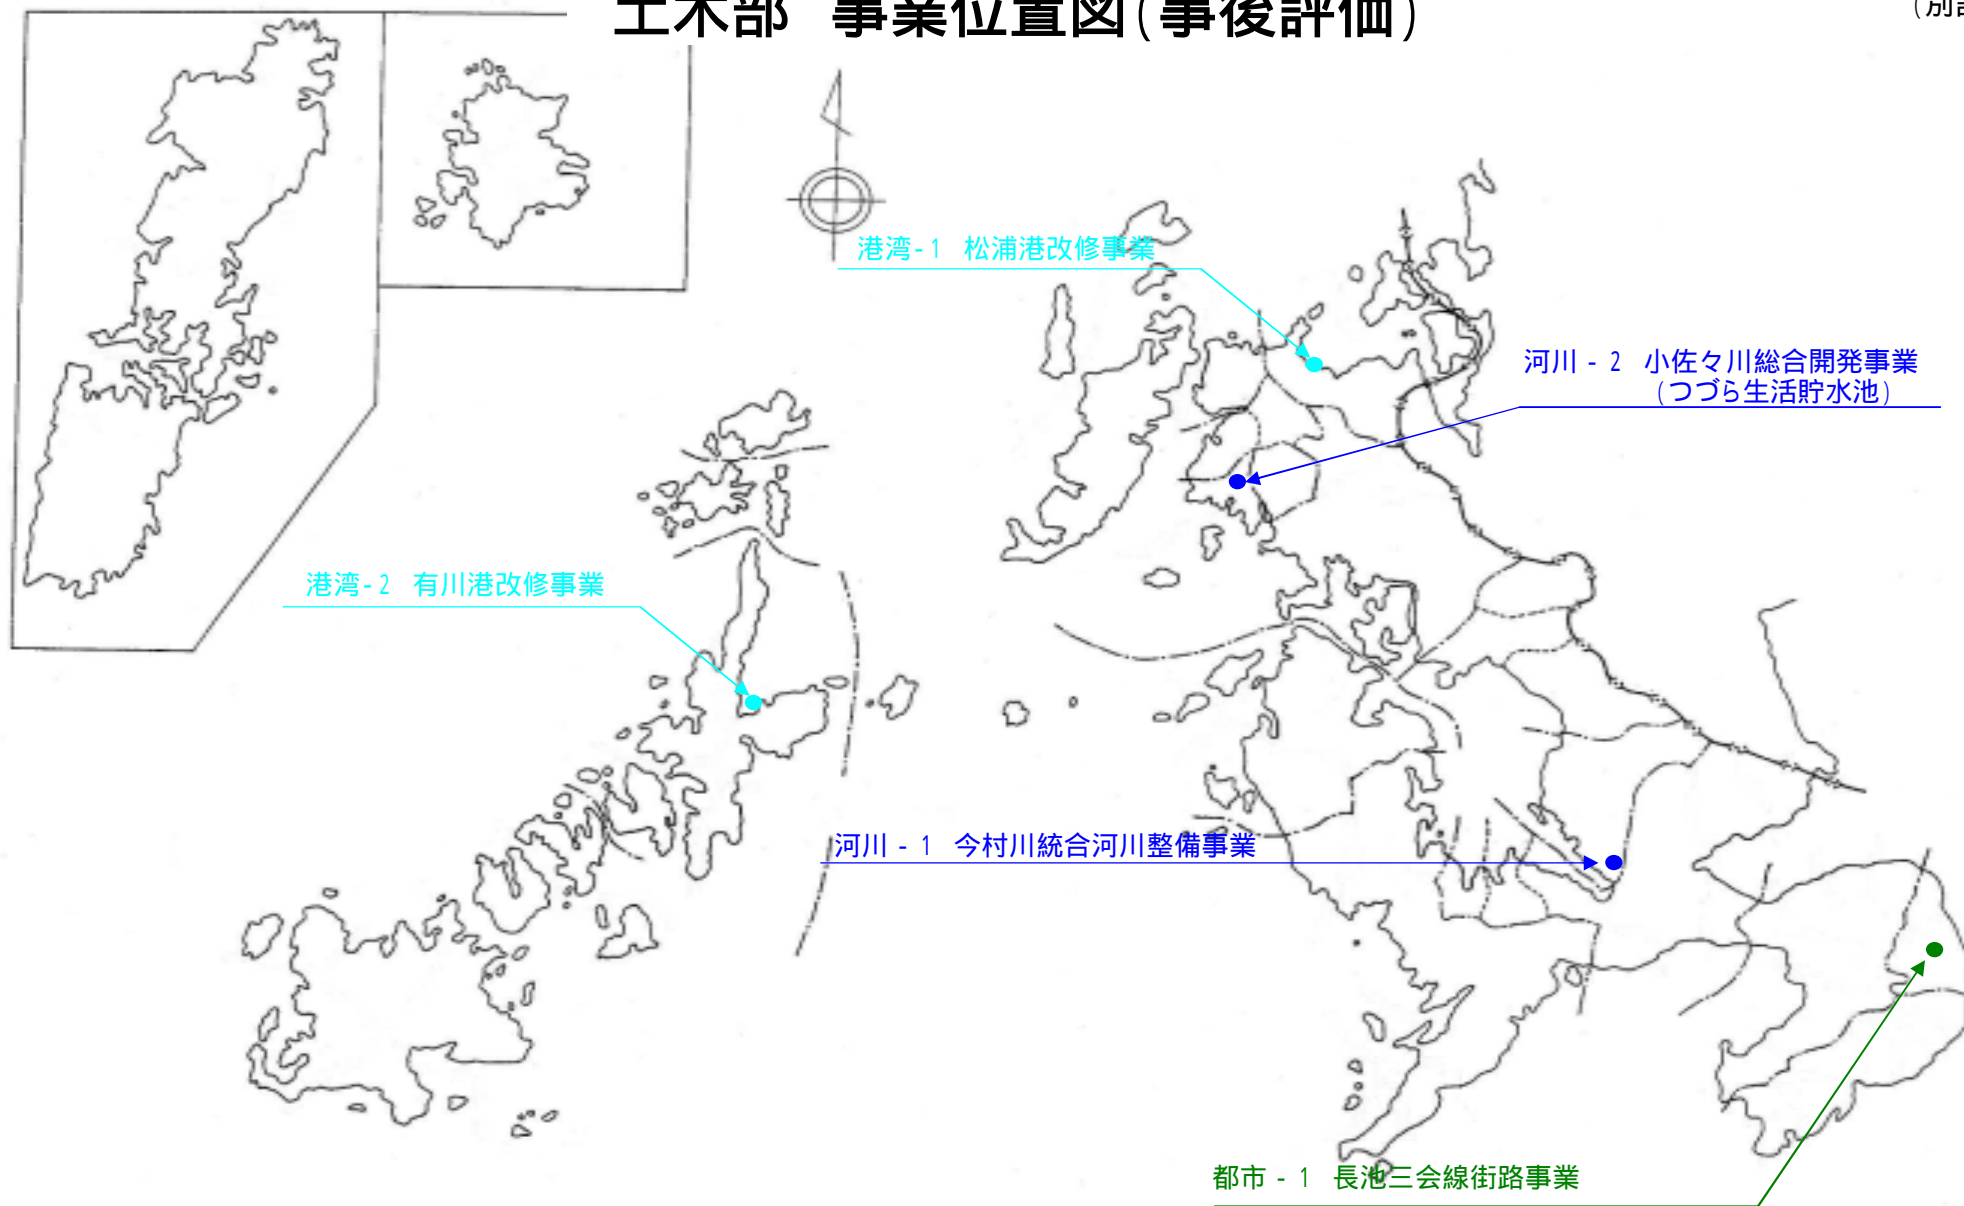

# 平成21年度 事後評価対象事業一覧表

| 整理<br>番号  | 事業計画            |      |                               |    |     | 該当基準  | 事後評価の評価項目  |             |
|-----------|-----------------|------|-------------------------------|----|-----|-------|--|-------------|
|           | 事業名 / 施設名       | 事業箇所 | 事業概要                          | 工期 |     |       |  | 事業費<br>(億円) |
|           |                 |      |                               | 着工 | 完了  |       |  |             |
| 都計<br>- 1 | 街路事業<br>/ 長池三会線 | 島原市  | 延長 L=1.31km<br>幅員 W=12m ~ 18m | H3 | H16 | 25.80 | 再評価実施、<br>事業費<br>10億円以上、<br>事業完了後<br>5年  |             |
|           |                 |      |                               |    |     |       | <p>(費用対効果の選定の基礎となった要因の変化)<br/>普賢岳の噴火(H3.6)に伴う既存道路の拡幅工事や橋梁工事が急ピッチ行われたことにより、当路線の迂回路的な道路が整備された。</p> <p>(事業の効果の発現状況)<br/>周辺県道とともに、緊急輸送道路網を構築しており、交通量は増加している。</p> <p>(事業実施による環境の変化)<br/>国道251号の渋滞緩和、災害時の避難路として活用されている。</p> <p>(社会経済情勢の変化)<br/>県道野田島原線(H12完)、県道礪石原停車場線(H12完)、がまだすロード(H15完)などの周辺道路が整備された。</p> <p>(今後の事後評価の必要性)<br/>事業効果が発揮できていると判断されるため必要性はない。</p> <p>(改善措置の必要性)<br/>供用効果は利用者に認知され、国道251号の交通量が分散される、沿線の土地利用が促進されるなど、市街地の健全な発展に重要な役割を果たしており、現段階での改善措置の必要性はない。</p> <p>(同種事業の計画・調査のあり方や事業評価手法の見直しの必要性)<br/>特になし。</p> |             |
|           |                 |      |                               |    |     |       | 対応方針(原案)   |             |
|           |                 |      |                               |    |     |       | (評価結果の同種事業への反映等)<br>・特になし  |             |



# 平成21年度 事後評価対象事業一覧表

| 整理番号      | 事業計画      |       |  |     |     | 該当基準  | 事後評価の評価項目   |             |
|-----------|-----------|-------|--|-----|-----|-------|---|-------------|
|           | 事業名 / 施設名 | 事業箇所  | 事業概要   | 工期  |     |       |   | 事業費<br>(億円) |
|           |           |       |  | 着工  | 完了  |       |   |             |
| 港湾<br>- 1 | 松浦港改修事業   | 松浦市   | 防波堤(北) 90m<br>防波堤(内) 50m<br>泊地(-3m) 2,910m <sup>3</sup><br>物揚場(-3m)(A) 90m<br>物揚場(-3m)(B) 170m<br>物揚場(-3m)(C) 30m<br>浮棧橋 1基<br>道路(A) 6m x 163.8m | S63 | H16 | 26.5  | <p>再評価実施、事業費10億円以上、事業完了後5年</p> <p>(費用対効果の選定の基礎となった要因の変化)<br/>H14再評価時 54隻 H21事後評価時 54隻(H19年度分港勢調査)<br/>(事業の効果の発現状況)<br/>属地陸揚量:<br/>H14再評価時 2,001t(1,640百万) H21事後評価時 2,296t(1,794百万)<br/>属人陸揚量:<br/>H14再評価時 165t(79百万) H21事後評価時 558t(413百万)<br/>(事業実施による環境の変化)<br/>特になし<br/>(社会経済情勢の変化)<br/>H18.1に市町村合併(松浦市・福島町・鷹島町 松浦市)<br/>(今後の事後評価の必要性)<br/>再事後評価の必要はない<br/>(改善措置の必要性)<br/>改善措置の必要はない<br/>(同種事業の計画・調査のあり方や事業評価手法の見直しの必要性)<br/>特になし</p> |             |
| 対応方針(原案)  |           |       |  |     |     |       | (評価結果の同種事業への反映等)<br>・特になし   |             |
| 港湾<br>- 2 | 有川港改修事業   | 新上五島町 | 防波堤(B)76.2m<br>泊地(-6.0m)(防波堤撤去)150m<br>泊地(-6.0m)340m <sup>2</sup><br>岸壁(-6.0m)135m<br>浮棧橋(A)(移設)1基<br>浮棧橋D)1基<br>道路(B)6m*800m<br>ふ頭用地            | H4  | H16 | 43.00 | <p>再評価実施、事業費10億円以上、事業完了後5年</p> <p>(費用対効果の選定の基礎となった要因の変化)<br/>・観光客数の増加 整備前:89,466人 整備後:111,352人(H16~H19平均)<br/>(事業の効果の発現状況)<br/>・観光客数の増加 整備前:89,466人 整備後:111,352人(H16~H19平均)<br/>(事業実施による環境の変化)<br/>・フェリー会社(美咲海送)の新規参入があった<br/>整備前:フェリー4便 高速船14便 整備後:フェリー8便 高速船14便<br/>(社会経済情勢の変化)<br/>・H16.8に市町村合併(有川町 新上五島町)<br/>(今後の事後評価の必要性)<br/>・再事業評価の必要性なし<br/>(改善措置の必要性)<br/>改善措置の必要性なし<br/>(同種事業の計画・調査のあり方や事業評価手法の見直しの必要性)<br/>・特になし</p>        |             |
| 対応方針(原案)  |           |       |  |     |     |       | (評価結果の同種事業への反映等)<br>・特になし   |             |

# 平成21年度 事後評価対象事業一覧表

| 整理<br>番号  | 事業計画                      |                     |   |    |     | 該当基準  | 事後評価の評価項目                               |   |
|-----------|---------------------------|---------------------|---|----|-----|-------|---|---|
|           | 事業名 / 施設名                 | 事業箇所                | 事業概要  | 工期 |     |       |   | 事業費<br>(億円)   |
|           |                           |                     |   | 着工 | 完了  |       |   |   |
| 河川<br>- 1 | 統合河川整備事業<br>/ 今村川         | 諫早市<br>大村市          | 今村川 L=2,780m<br>真崎川 L=2,040m<br><br>河道拡幅、築堤、護岸<br>整備、橋梁架替、堰改築 | H1 | H16 | 50.50 | 再評価実施、<br>事業費<br>10億円以上、<br>事業完了後<br>5年 | (費用対効果の選定の基礎となった要因の変化)<br>・特に無し<br>(事業の効果の発現状況)<br>・治水<br>事業完了後において、改修前の流下能力を超える降雨が毎年のように発生しているが、洪水被害は生じていない。<br>(事業実施による環境の変化)<br>・利水<br>農業用水は改築された堰により確保されており問題は生じていない。<br>・環境<br>環境に大きな変化はないが、植物や鳥類及びホタル等が増えてきている、魚が減った、ヨシが繁茂した、という意見がある。<br>・親水<br>管理用道路が整備され散策等の利用が増えているが、水遊びや魚釣りが減っている。<br>・その他<br>地域による清掃活動が活発になってきている。<br>(社会経済情勢の変化)<br>・真崎川上流では「諫早西部開発事業」による宅地化が進んでいる。<br>(今後の事後評価の必要性)<br>・本事業により洪水被害が軽減されており、今後の事後評価の必要性はない。<br>(改善措置の必要性)<br>・改善措置の必要性は特になし。<br>(同種事業の計画・調査のあり方や事業評価手法の見直しの必要性)<br>・特に見直しの必要はない。 |
|           |                           |                     |   |    |     |       |   | 対応方針(原案)  |
|           |                           |                     |   |    |     |       |   | (評価結果の同種事業への反映等)<br>・特になし   |
| 河川<br>- 2 | 小佐々川総合開発<br>事業<br>/ つづらダム | 佐世保<br>市(旧小<br>佐々町) | 重力式コンクリートダム<br>堤高:21.6m                                       | H2 | H15 | 54.80 | 再評価実施、<br>事業費<br>10億円以上、<br>事業完了後<br>5年 | (費用対効果の算定の基礎となった要因の変化)<br>・特に変化は見られない。<br>(事業の効果の発現状況)<br>・完成後から現在までの主な大雨が降った時を検証した結果、下流において水位を下げる効果が見られた。<br>・完成後から現在まで、水道用水を安定的に供給できている。<br>・完成後から現在までの渇水時において、ダムからの補給により河川の流れや水量を安定させている。<br>(事業実施による環境の変化)<br>・特に変化は見られない。<br>(社会経済情勢等の変化)<br>・特に変化は見られない。<br>(今後の事後評価の必要性)<br>・本事業による大雨や渇水時におけるダムの効果を確認しており、今後、政策評価に基づく事後評価の必要はない。<br>(改善措置の必要性)<br>・改善措置の必要性は特になし。<br>(同業種の計画・調査のあり方や事業評価手法の見直しの必要性)<br>・見直しの必要性は特になし。  |
|           |                           |                     |   |    |     |       |   | 対応方針(原案)  |
|           |                           |                     |   |    |     |       |   | (評価結果の同種事業への反映等)<br>特になし  |
