

平成20年度

長崎県公共事業評価監視委員会意見書

平成21年2月16日

長崎県公共事業評価監視委員会

委員長 園田 圭介



平成20年度長崎県公共事業評価監視委員会意見書

1. 意見

諮問があった再評価対象事業の「長崎水害緊急ダム事業」については、対応方針（原案）どおり「見直し継続」を認めることに決定しましたので、答申します。

2. 審議過程における意見

【再評価対象事業】

・長崎水害緊急ダム事業

諮問された現行事業は、中島川、浦上川の既設水道専用ダムを治水化し、その代替水源確保のために、雪浦第2ダム等を新設する事業内容であった。

しかし、社会情勢や周辺状況の変化等に伴う検討の結果、既設浦上ダムを嵩上げするなど有効活用し、必要な治水容量及び利水容量を確保する計画へ変更することで、雪浦第2ダムを建設中止とする「事業計画の見直し」は、浦上川の早期治水対策、老朽化した浦上ダムの改良強化が可能になるとともに、経済性の上からも妥当であると認められる。

ただし、雪浦第2ダムの中止に伴う雪浦川の治水対策、浦上ダム改築工事期間中に懸念される渇水や濁水対策及び改築後の排水対策等については、関係市等を含めて十分協議検討されたい。


3. 平成20年度の審議経過

・第4回委員会（平成21年2月2日開催）

再評価対象事業の現地調査、説明及び審議

土木部 事業位置図(再評価)

(別記5)

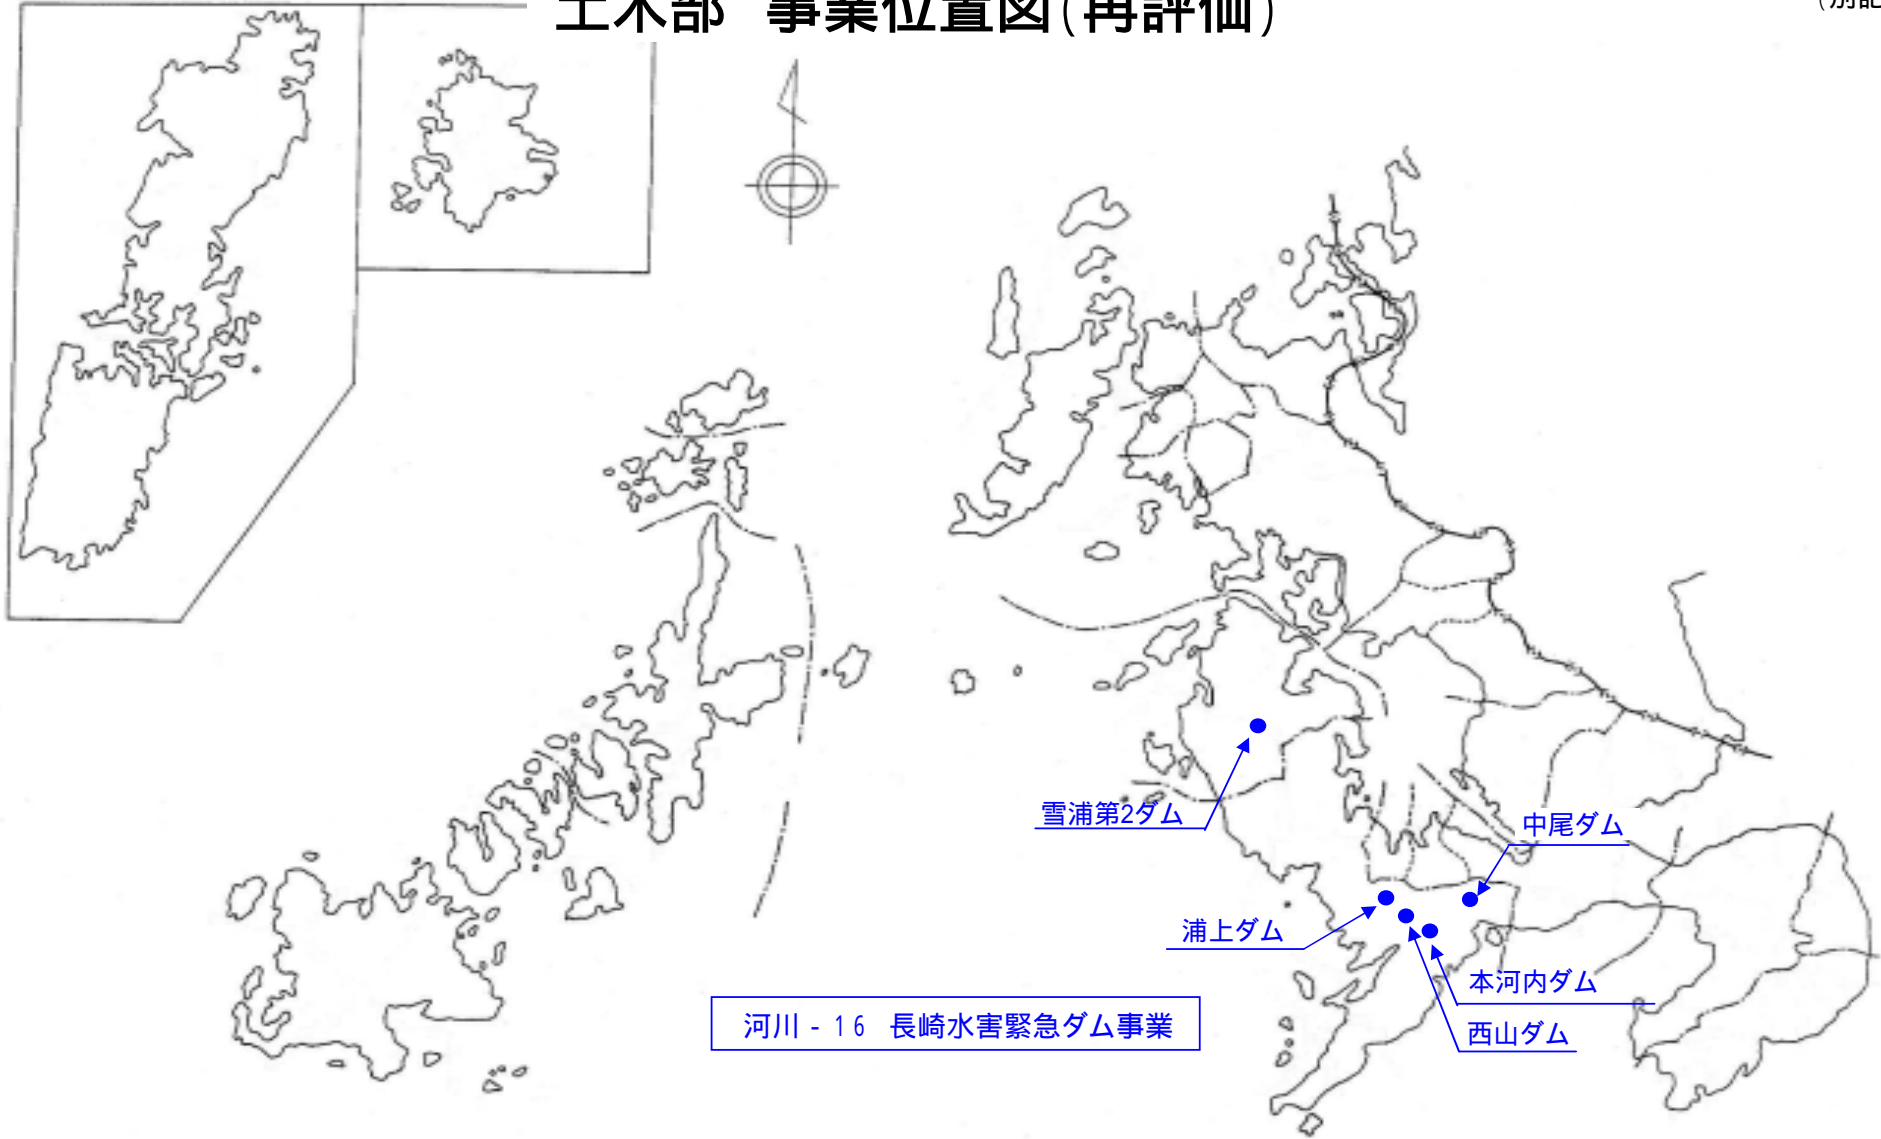

平成20年度 再評価対象事業一覧表

整理 番号	事業計画								再評価の 理由	進捗率 (%)	前回 審議 年度	対応方針 (原案)
	事業名	施設名	事業 主体	事業箇所	事業概要	工期		事業費 (億円)				
						着工	完了					
上段：当初 下段：変更												
土木部												
河川課												
河川 - 16	長崎水害緊急ダム 事業	本河内ダム 西山ダム 浦上ダム 中尾ダム 雪浦第2ダム	県	長崎市 西海市	新設2ダム 改築3ダム	S58	H22	775	再評価後 5年経過	80.7	H15	見直し 継続
					新設1ダム 改築3ダム	S58	H28	620				
